


再評価時再評価結果(平成28年度)

担当課 : 徳島県砂防防災課

担当課長名 : 酒井 彰彦

事業の概要

事業名	通常砂防事業	事業区分	通常砂防事業	事業主体	徳島県
事業箇所	徳島県美馬市美馬町嫁坂	箇所名	嫁坂谷		
事業概要	砂防堰堤1基(H=8.0m L=39.5m V=1147m ³), 溪流保全工 L=132.1m				
事業の目的・必要性	<p>本溪流の上流部は荒廃しており、出水時に土石流が発生すると下流の人家や道路・小学校等に被害を及ぼす恐れがある。</p> <p>当地区内には、人家164戸や避難所である小学校・緊急輸送路である県道等があり、地域住民の人命や財産を守るため、平成24年度より通常砂防事業に着手した。</p>				
総事業費	175 百万円		進捗率	8%	

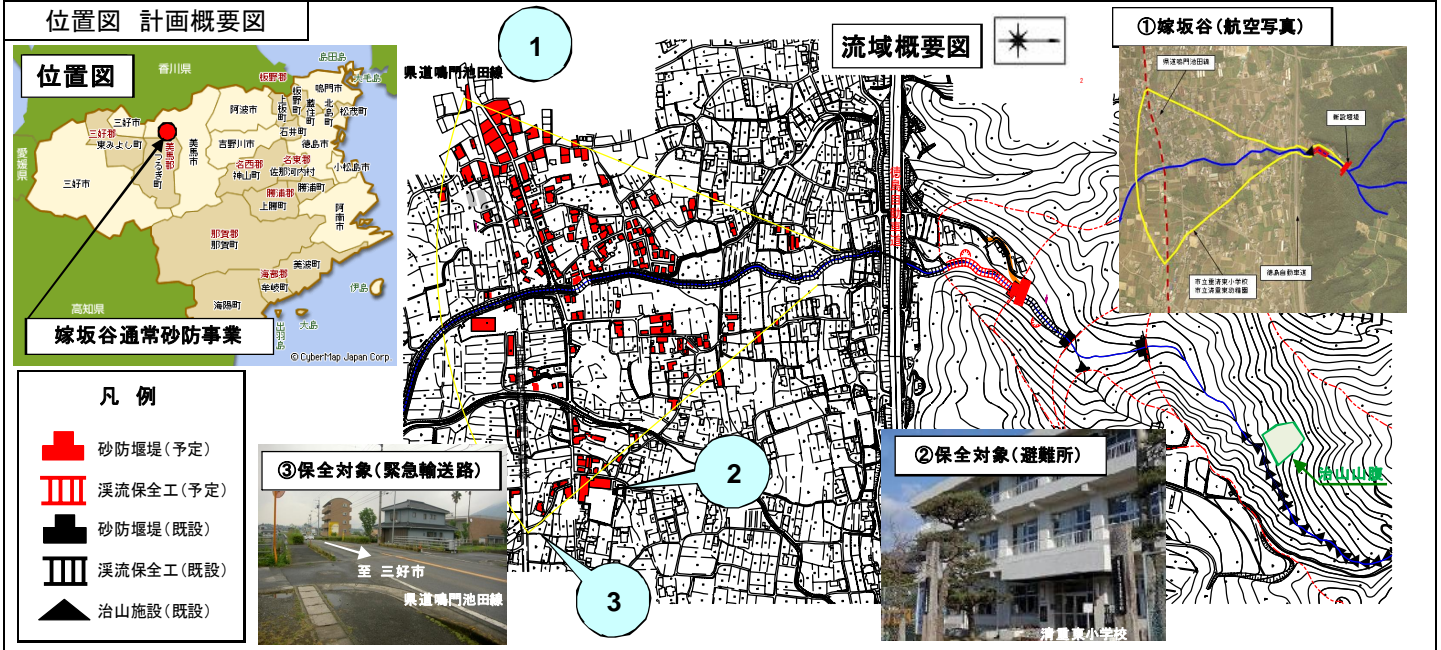

事業評価結果

事業全体の投資効率性	基準年度	B/C	残事業B/C	総費用		総便益	
	平成28年度	6.6	7.1	1.8億円	用地費・工事費等	11.7億円	人家164戸、道路、小学校等
事業の効果等	<p>・保全対象の人家164戸とその住民の人命と財産を保全する。(一般資産被害軽減効果・人的被害軽減効果)</p> <p>・避難所である小学校、緊急輸送路である県道を保全し、地域の防災力の向上を図る。</p>						
社会経済情勢等の変化	<p>溪流上流側では、治山事業による山腹工の整備が今年度より図られている。また、H26.11月に土砂災害警戒区域を指定するなど、土砂災害に対して地域の防災面の向上に努めている。</p>						
事業の進捗状況	<p>これまでに地形測量・詳細設計を実施中であり、用地は未買収である。現在の進捗率は事業費ベースで8%である。</p>						
事業進捗の見込み	<p>事業計画に関して、用地関係者の一部から同意が得られていない。</p>						
対応方針	<p>事業中止</p>						
対応方針理由	<p>事業の早期着手が困難なことから総合的に判断した。</p>						

※総費用、総便益は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。

中止の理由

用地関係者の同意が得られず、工事未着工となっている。用地取得に向けて取り組んできたが、未だ同意が得られず、今後の事業進捗が見込めないことから、事業を中止する。

なお、同溪流においては、基礎調査に基づき土砂災害警戒区域の指定を完了しており、今後、ハザードマップの作成や防災訓練等を通して、防災面に対する更なる意識の向上に努める。
