

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	未来へつなぐ良好な河川環境づくりの推進																				
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）				交付対象	徳島県															
計画の目標	「清流ルネッサンスⅡ」に基づき、行政と地域住民が一体となり、良好な河川環境づくりを推進する。																				
計画の成果目標（定量的指標）	・汚濁の著しい河川の水質改善を図るため、下水道事業連携し、浚渫及び直接浄化施設の整備を実施し水質の改善を図る。																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> <tr> <td>① 水質汚濁の著しい河川について、下水道事業と連携し、清流ルネッサンスⅡの目標値であるBOD5mg/l以下(H30)を目指す。</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5mg/l(H30)</td> </tr> </table>										定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	① 水質汚濁の著しい河川について、下水道事業と連携し、清流ルネッサンスⅡの目標値であるBOD5mg/l以下(H30)を目指す。	-	-	5mg/l(H30)
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																	
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																		
	① 水質汚濁の著しい河川について、下水道事業と連携し、清流ルネッサンスⅡの目標値であるBOD5mg/l以下(H30)を目指す。	-	-		5mg/l(H30)																
全体事業費	合計 (A+B+C)	230 百万円	A	230 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%											

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
徳島県公共事業評価検討委員会	平成28年3月
	公表の方法
	徳島県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 河川事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	河川	一般	徳島県	直接	徳島県	-	吉野川圏域総合流域防災事業	浚渫、浄化施設	藍住町	■	■	■	■	■	230.0	
小計（河川事業）														230.0		
合計														230.000		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・汚濁の著しい河川において汚泥の浚渫を実施し、水質の改善が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（水質汚濁の著しい河川について、下水道事業と連携し、清流ルネッサンスⅡの目標値であるBOD5mg/l以下(H30)を目指す）	最終目標値	5mg/l(H30)	目標値と実績値に差が出た要因
	最終実績値	みどり橋：4.6mg/l 仁徳橋：4.0mg/l		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				


3. 特記事項（今後の方針等）

・平成26年度の年平均BODにおいては目標値を達成したものの、年度によりばらつきが見られるため、今後も下水道事業と連携し、水質の改善に努める。
---

計画の名称	未来へつなぐ河川環境づくりの推進	交付対象	徳島県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

1-A1-1 吉野川圏域総合流域防災事業（正法寺川）


徳島県河川海岸図

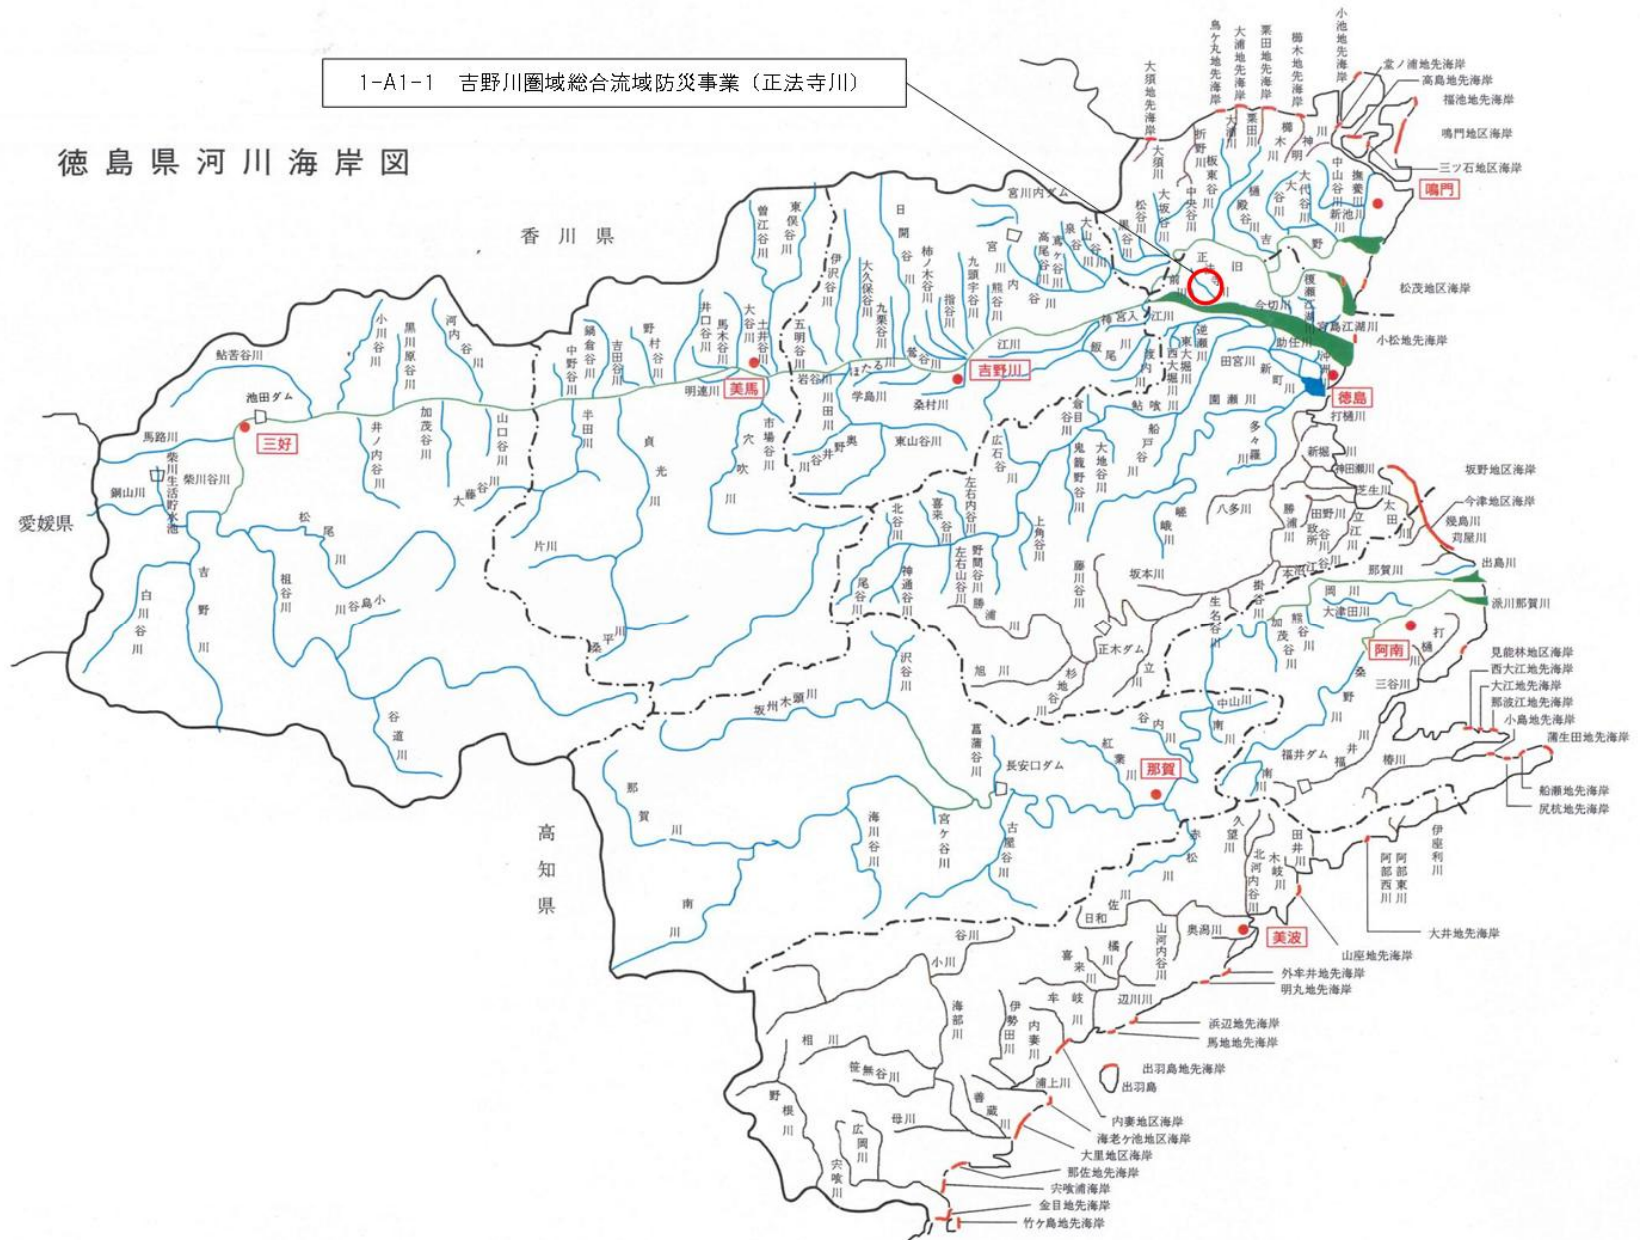

計画の名称	未来へつなぐ河川環境づくりの推進	交付対象	徳島県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

■主要な整備内容


徳島県河川海岸図

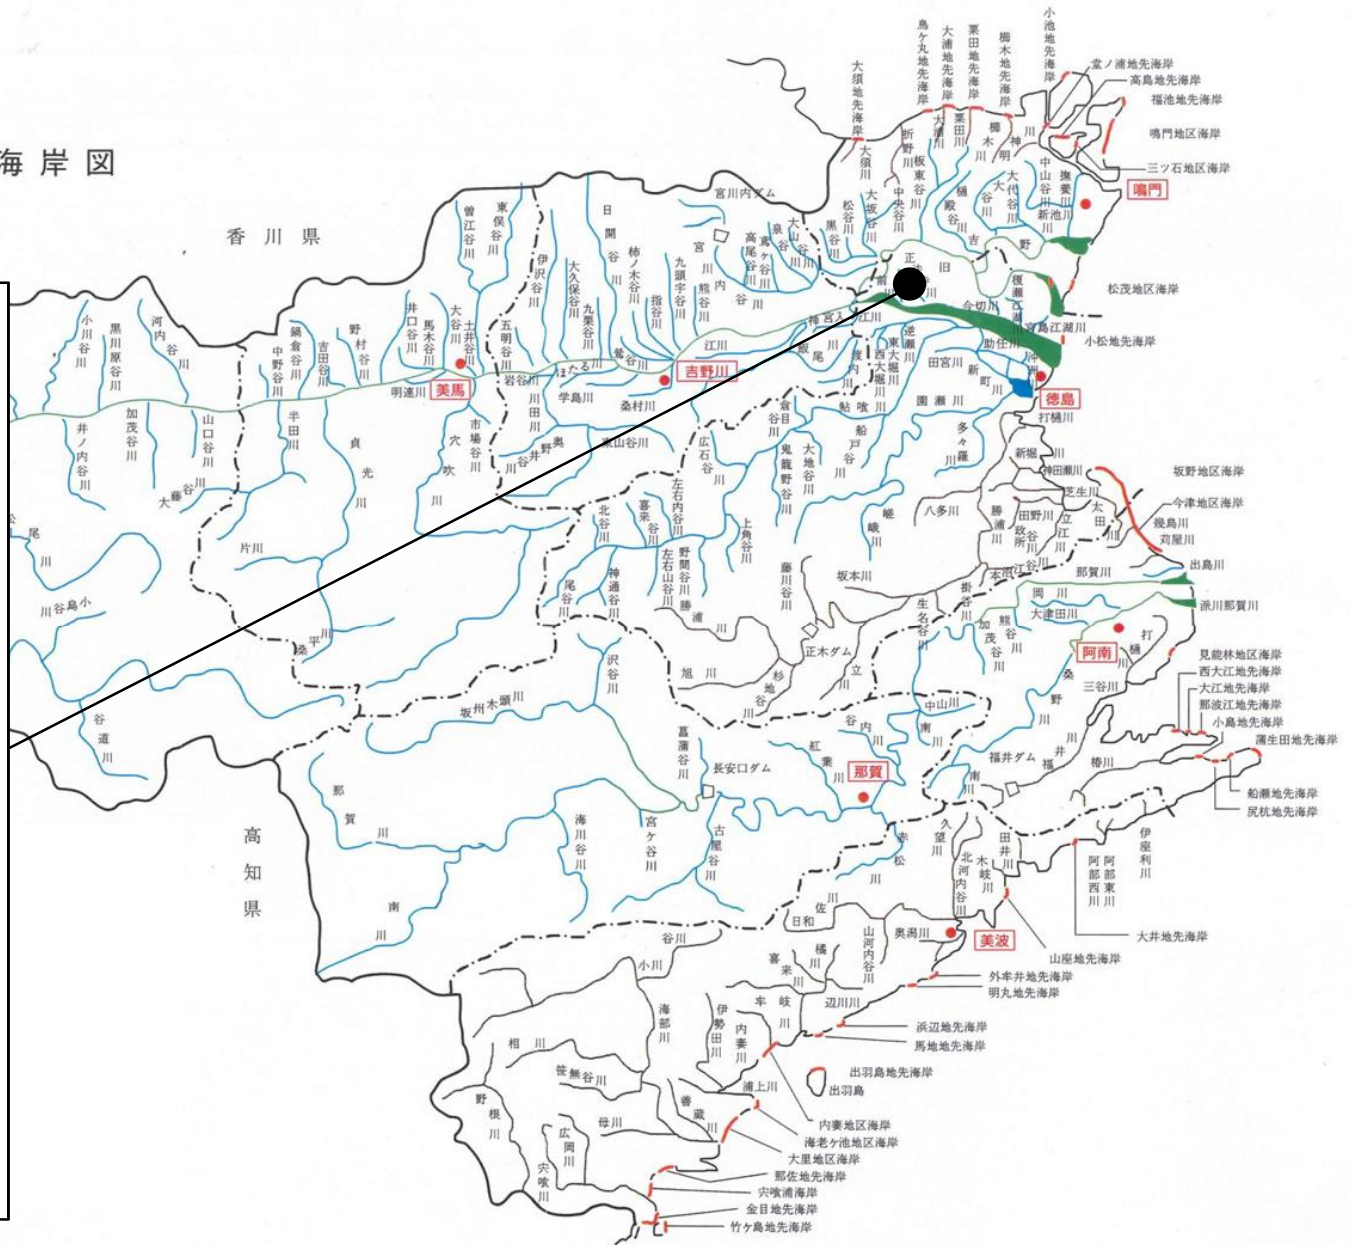

整備内容 総合流域防災事業 正法寺川



浚渫状況

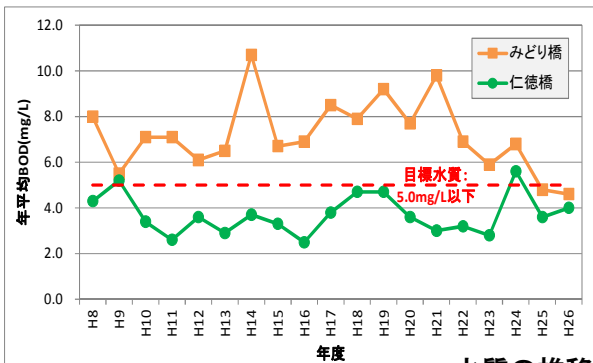

水質の推移
