


再評価【番号1】

湛水防除事業  
勝占地区




# 事業概要

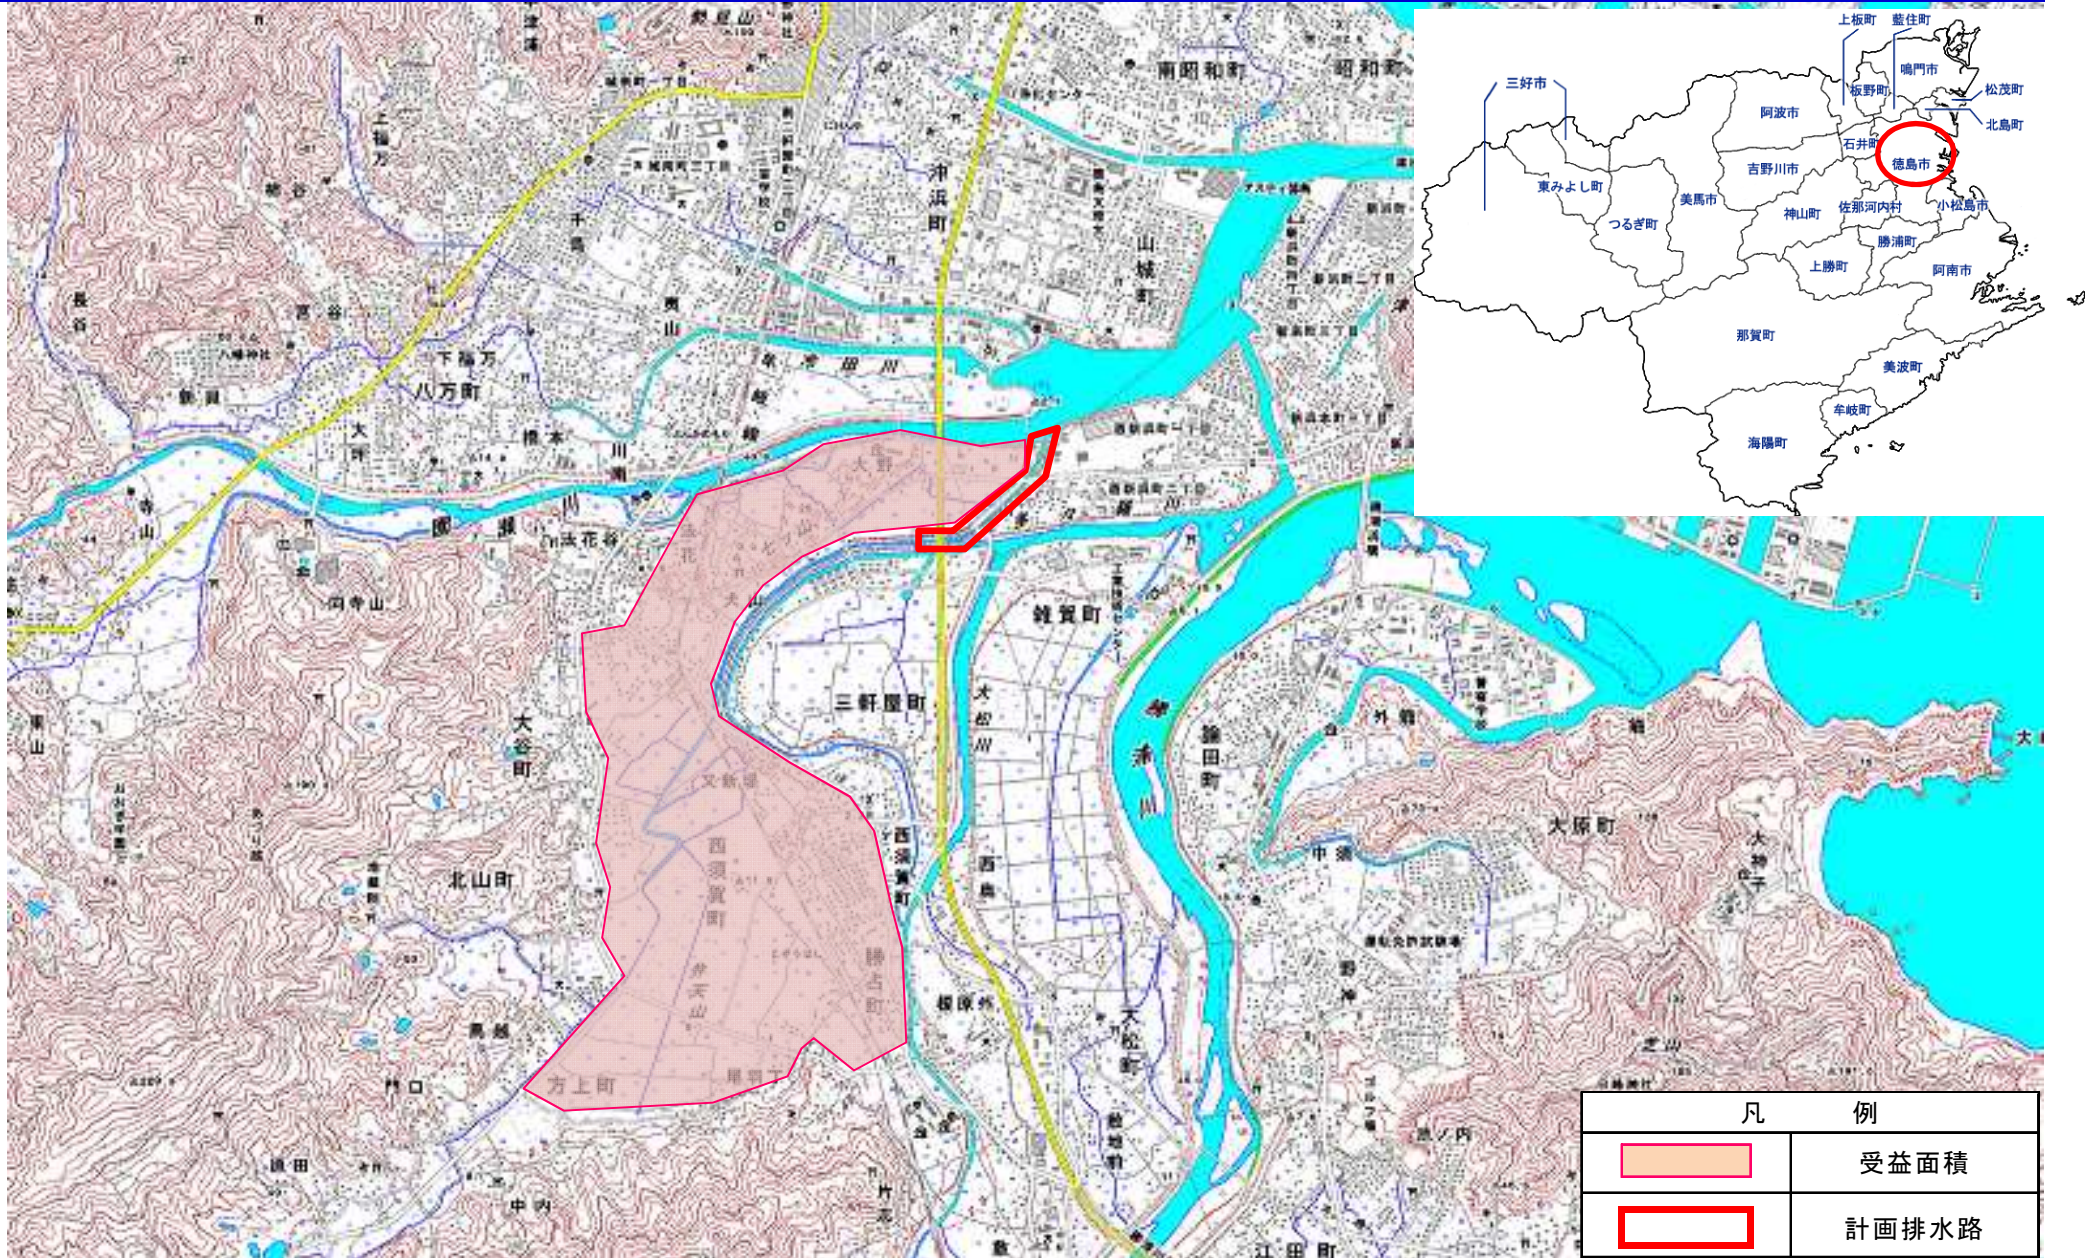



# 事業内容・進捗状況

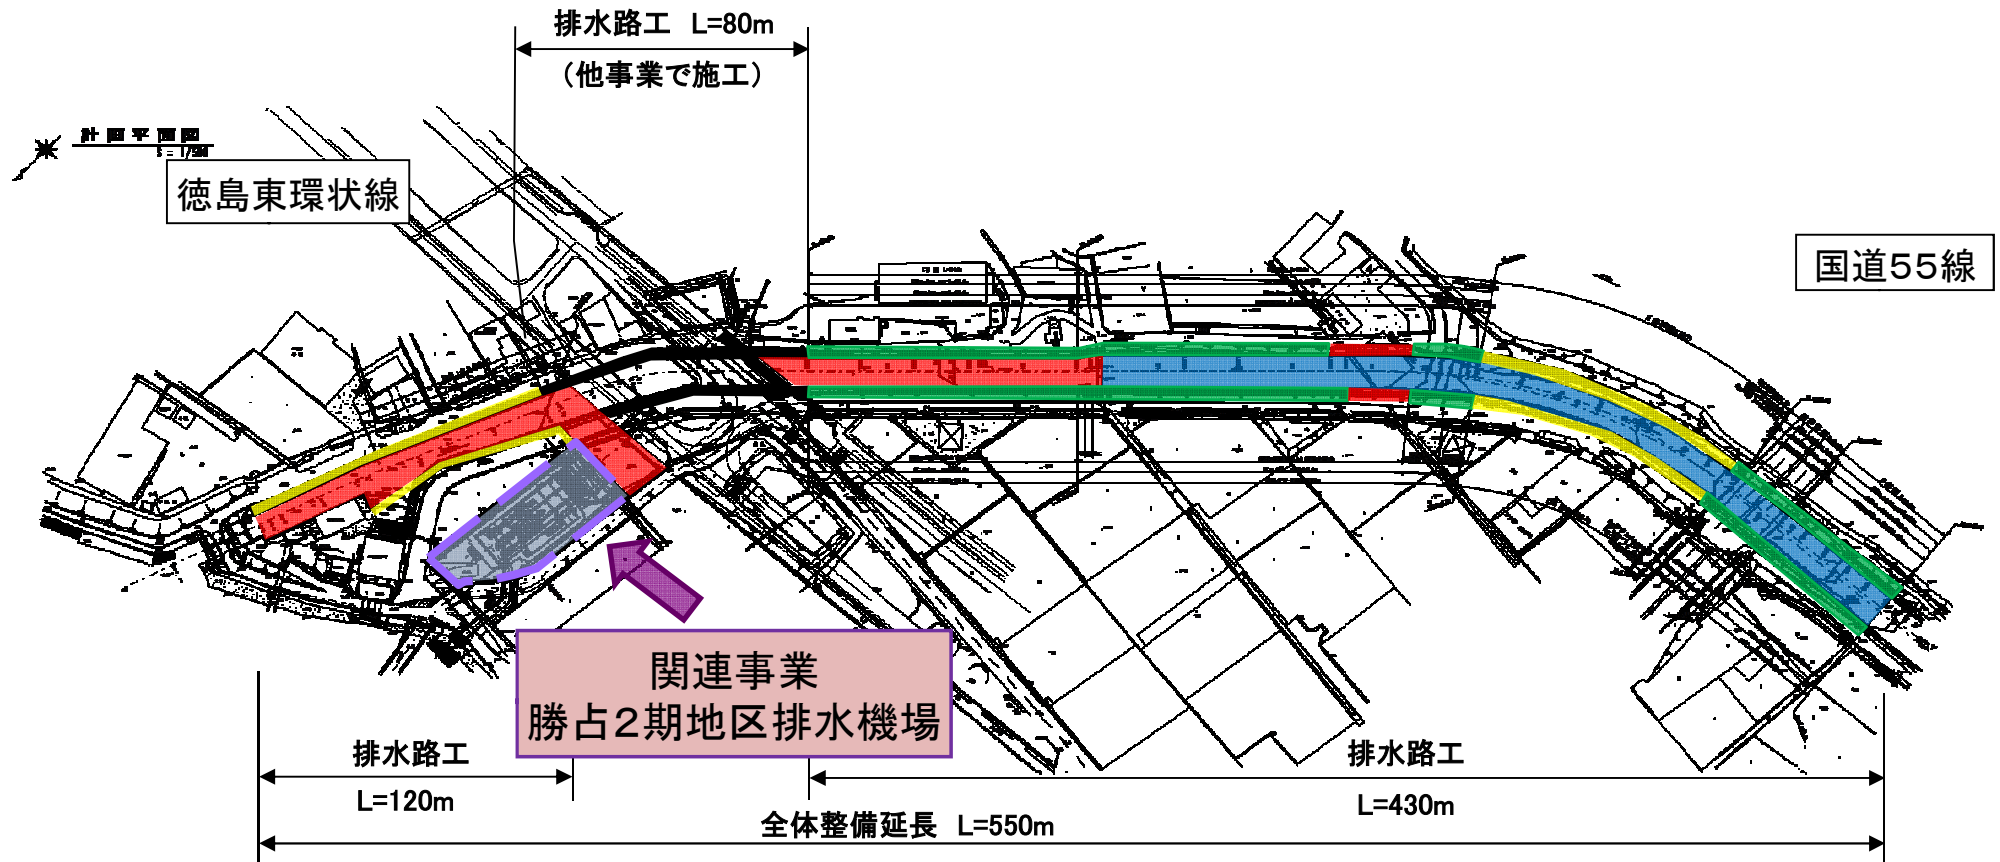


## 事業内容

受益面積 93.7ha  
 受益戸数 240戸  
 主要工事 排水路工 550m  
 総事業費 1,398,000千円  
 工期 平成10年度～平成30年度

## 凡例


	平成23年度まで
	平成24～28年度まで
	平成29年度予定
	平成30年度以降

# 事業効果の発現状況(1)

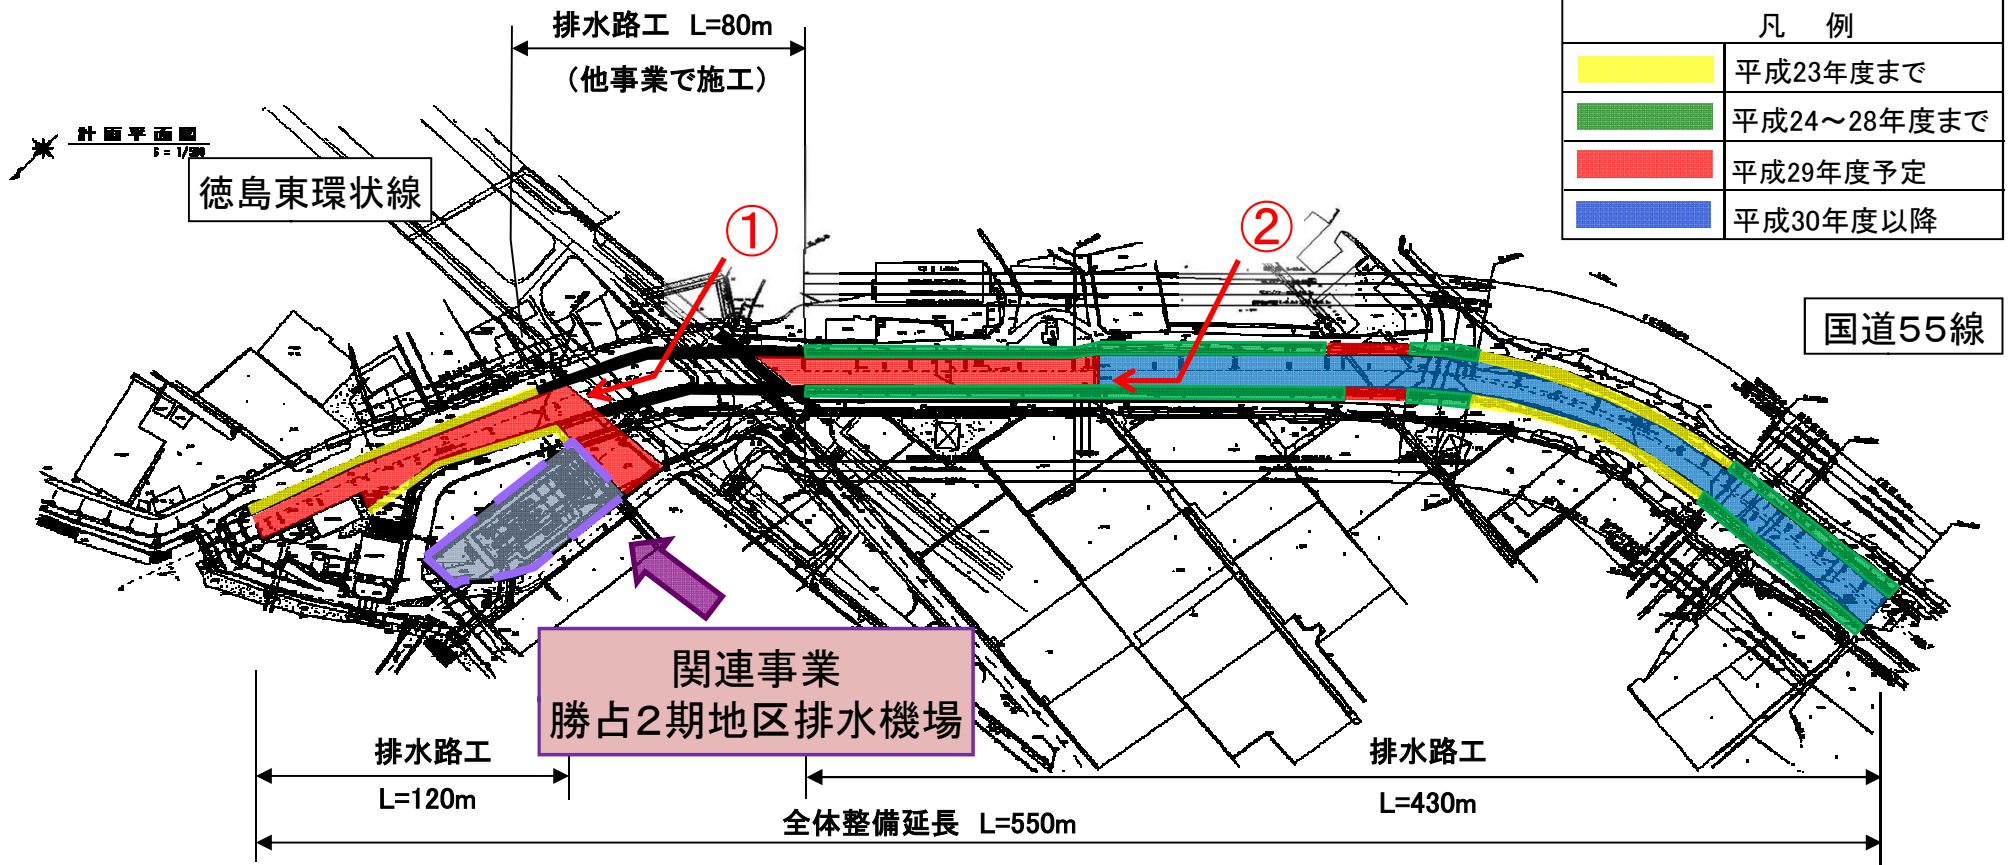



# 事業効果の発現状況(2)

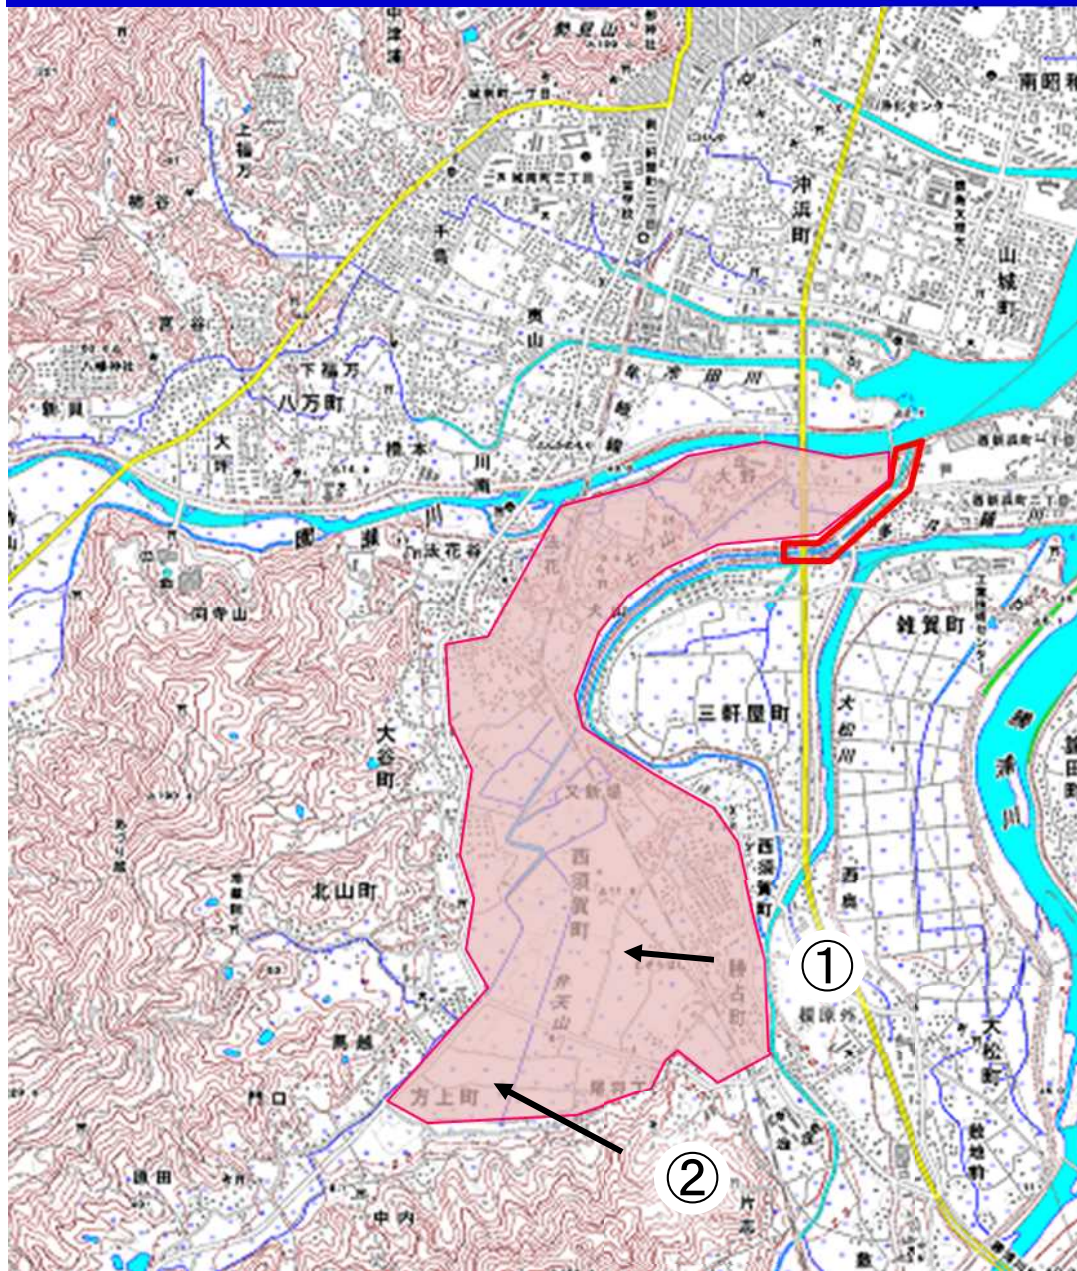

① 苺



② オクラ





# 前回の再評価以降の取組状況・今後の見通し

## 前回以降の取組

- ・工事に伴う借地等に関する地元調整
- ・市道通行規制に関する関係機関との調整

- ・護岸工事実施

## 今後の見通し

- ・護岸工実施(残L=23m)
- ・排水路の掘削

- ・平成30年度完了予定



# 費用対効果

## 総便益

1 更新効果

2 維持管理費節減効果

3 災害防止効果

計 **42億4,006万2千円**  
(現在価値)

総費用 **32億1,681万3千円**(現在価値)

**総便益** / **総費用** = **1.32**
