


再評価【番号11】砂防防災課

**汐谷3号谷
通常砂防事業**

1. 事業箇所

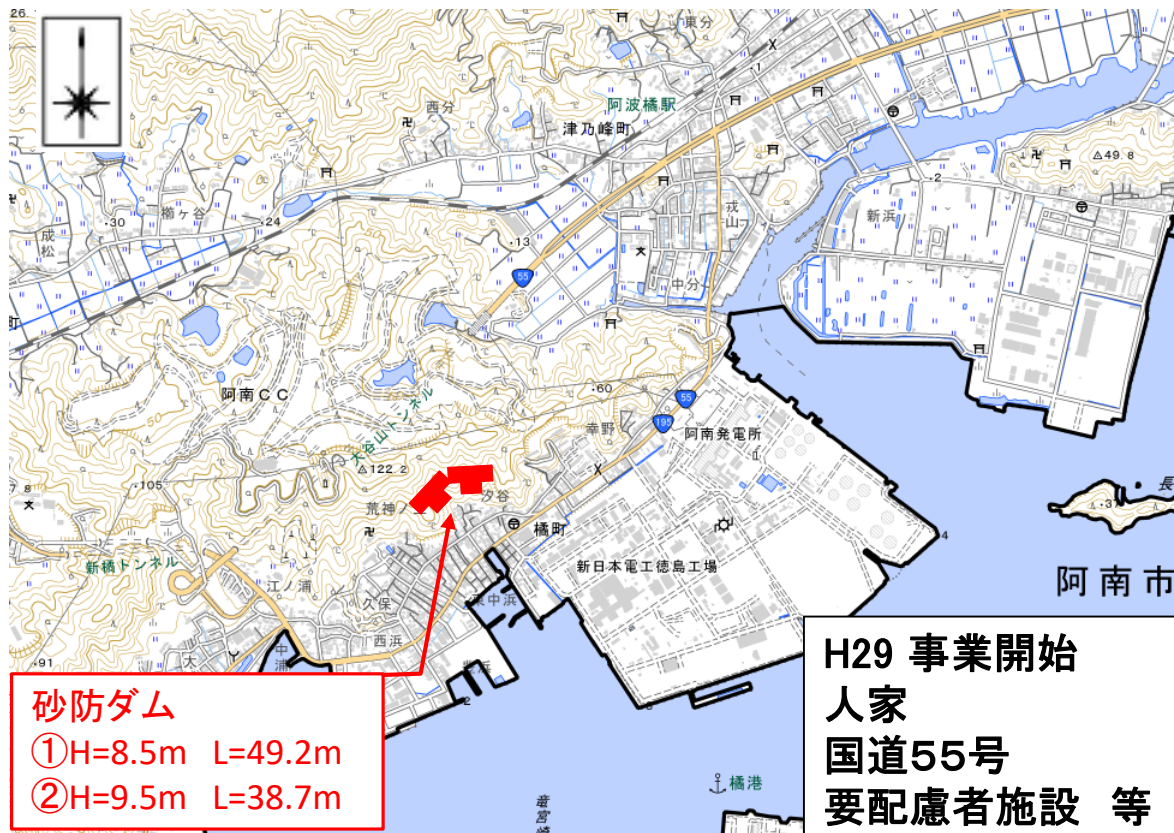


砂防ダム

① H=8.5m L=49.2m


② H=9.5m L=38.7m



2. 事業計画

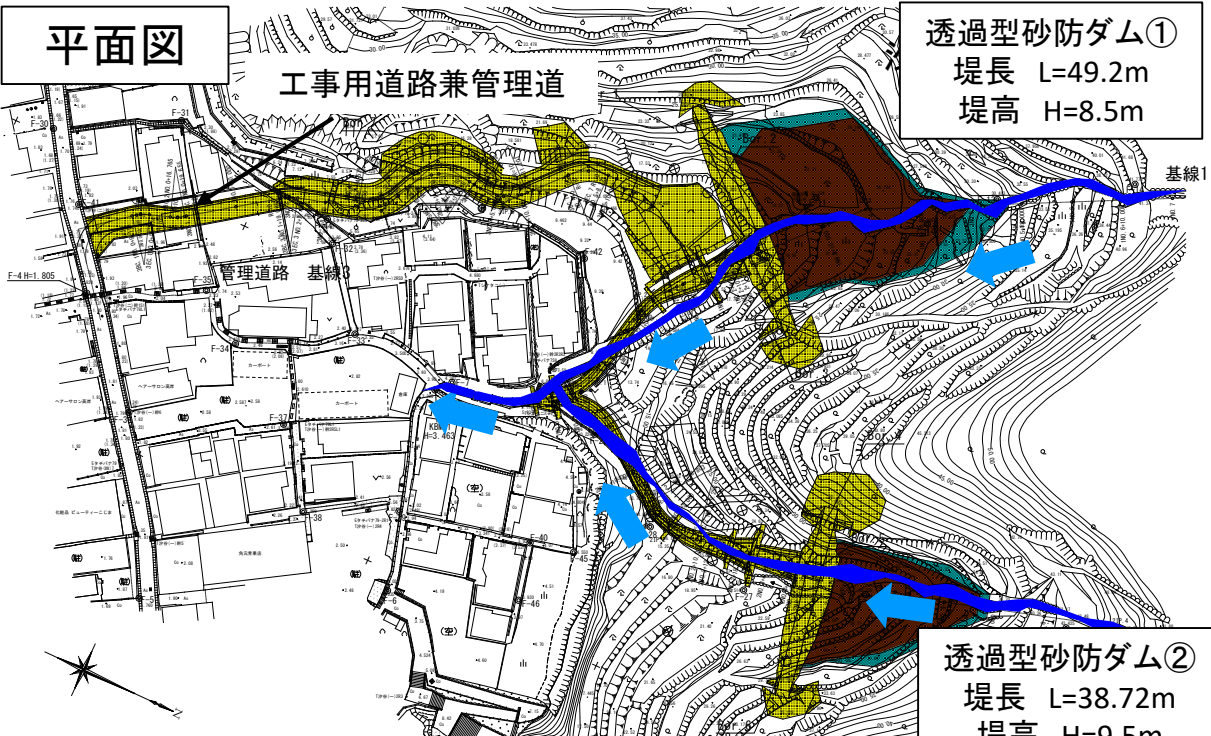

一般図

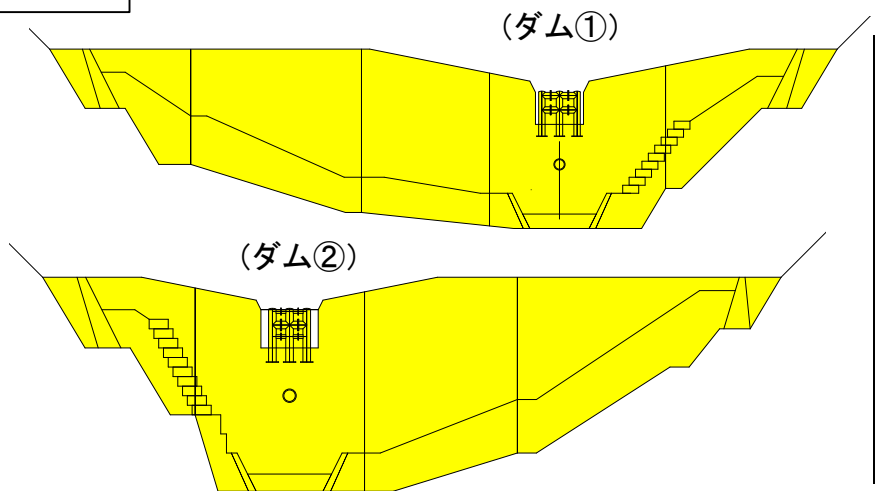

凡例

	施工済み(H31まで)
	施工予定(R2)
	施工予定(R3以降)

流域の凡例

	溪流
	計画堆砂域
	計画高水位
	流向

3. 費用対効果について

費用対効果分析

総費用

- 事業費
- 維持管理費

C = 3.5億円 (現在価値化後)

総便益

- 一般資産被害軽減
- 公共土木施設被害軽減
- 公益事業施設被害軽減
- 応急対策費用軽減
- 人的被害軽減
- (人的被害による)精神的被害軽減

B = 86.8億円 (現在価値化後)



B / C = 24.9


主な保全対象

保全対象

- 保全人家97戸
- 要配慮者利用施設
- 国道55号
(緊急輸送路)



人家等

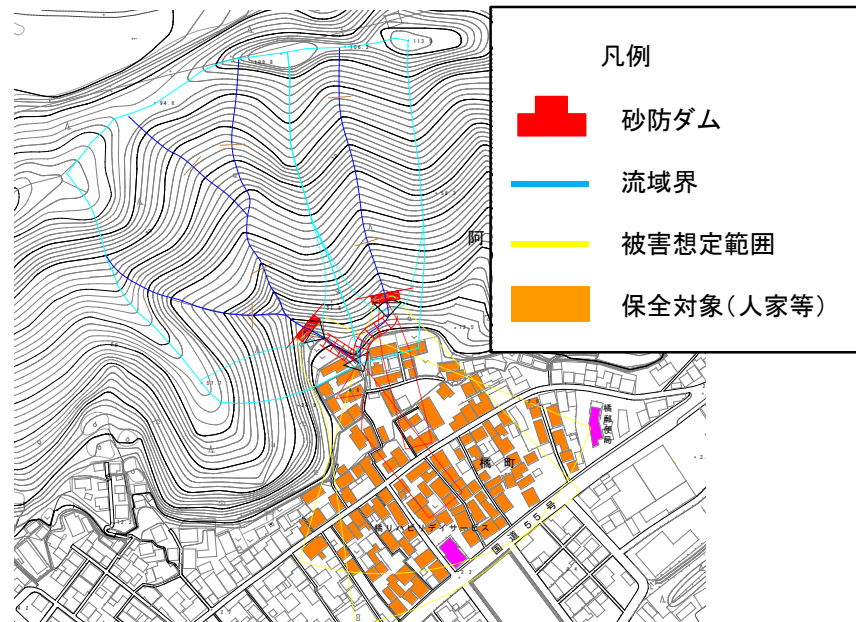

4. 事業の経緯及び結果について

H29.4月 新規事業着手



H31.4月～ 用地境界立会を順次実施



隣接を含む用地関係者多数により
境界立会に期間を要した。

R2.4月～ 用地交渉開始



相続人を含む用地関係者が多いこと、
及び補償価格で折り合わず、交渉が難航。

R2.11月 年度内の用地取得完了が
見込めない



事業休止



関係者との交渉取組の強化を図る。

R3.2月 用地取得完了



事業継続

