

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月08日

計画の名称	広域防災拠点となる都市公園における防災機能の強化												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	徳島県												
計画の目標	近年の激甚化する災害を踏まえ、大規模の災害が発生した場合でも広域防災拠点として中枢の機能を十分に発揮するよう、都市公園施設の防災機能を強化する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	720	A	720	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	徳島県内の広域防災拠点となる都市公園において、重要インフラの緊急点検で機能強化対象に位置付けた施設について、平成31年度までに改修を完了させる。 防災機能強化した施設の割合 防災機能強化した施設数 / 緊急点検で機能強化対象に位置付けている公園施設数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---


A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	都市公園等事業(鳴門総合運動公園ほか2公園)(緊急点検)	非常用設備や貯水槽の改修、受変電設備の高上げ等改修、体育館の漏水対策、園路及び照明の改修等	徳島県						720		-	
												小計						720		
											合計						720			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 徳島県公共事業評価検討委員会	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 徳島県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	広域防災拠点となる都市公園において、老朽化した施設の更新や整備により、防災機能が強化されるとともに、指定避難所となる施設への空調設備新設等により、避難者のQOL（生活の質）の向上が図られる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	施設の更新や整備を行い、環境改善することで、安全で快適な利用が可能になることから、利用者の増加が見込まれる。
特記事項（今後の方針等）	
今後も頻発化・激甚化する災害に備え、広域防災拠点となる都市公園において、老朽化した施設などの改修や整備を計画的に行い、防災機能の強化を図り、公園利用者をはじめ、地域の安全・安心の確保に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	防災機能強化施設	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%

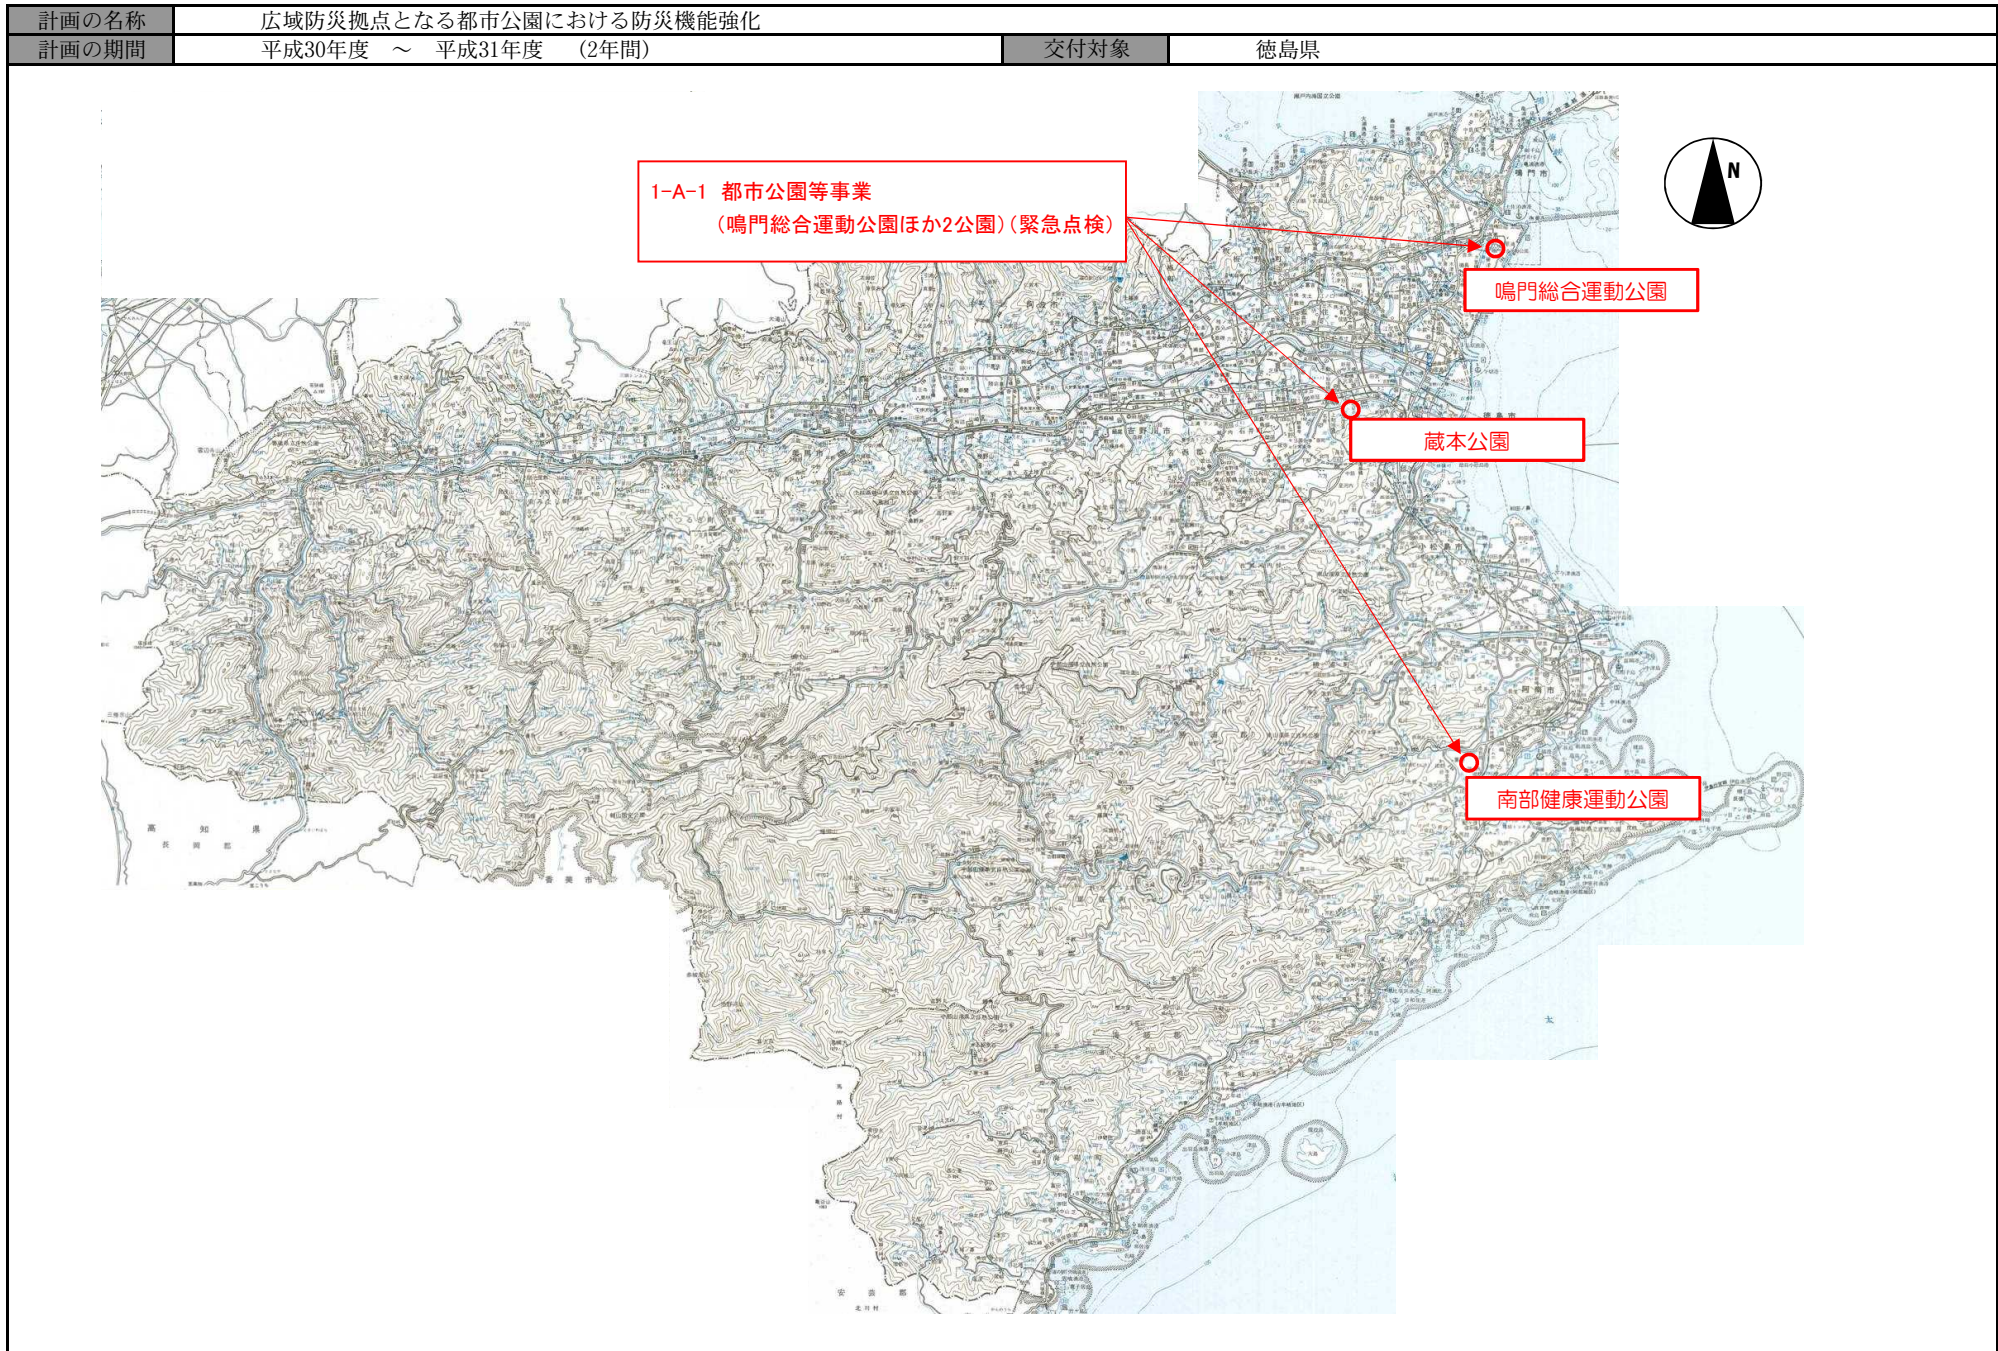

(参考図面)

計画の名称	広域防災拠点となる都市公園における防災機能強化	交付対象	徳島県
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)		

■ 対策事例：都市公園等事業（鳴門総合運動公園ほか2公園）（緊急点検）

鳴門総合運動公園

電気設備(受変電設備)の高上げ



体育館(避難所)屋根の防水対策



蔵本公園


体育ホール(避難所)の空調設備新設



体育ホール(避難所)の環境改善



南部健康運動公園

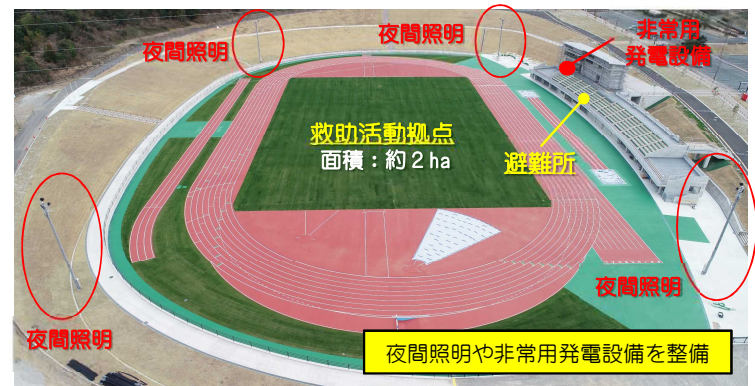

夜間照明や非常用発電設備を整備
