


再評価【番号2】

国営付帯県営農地防災事業  
大津東部東2期地区

# 1. 事業箇所



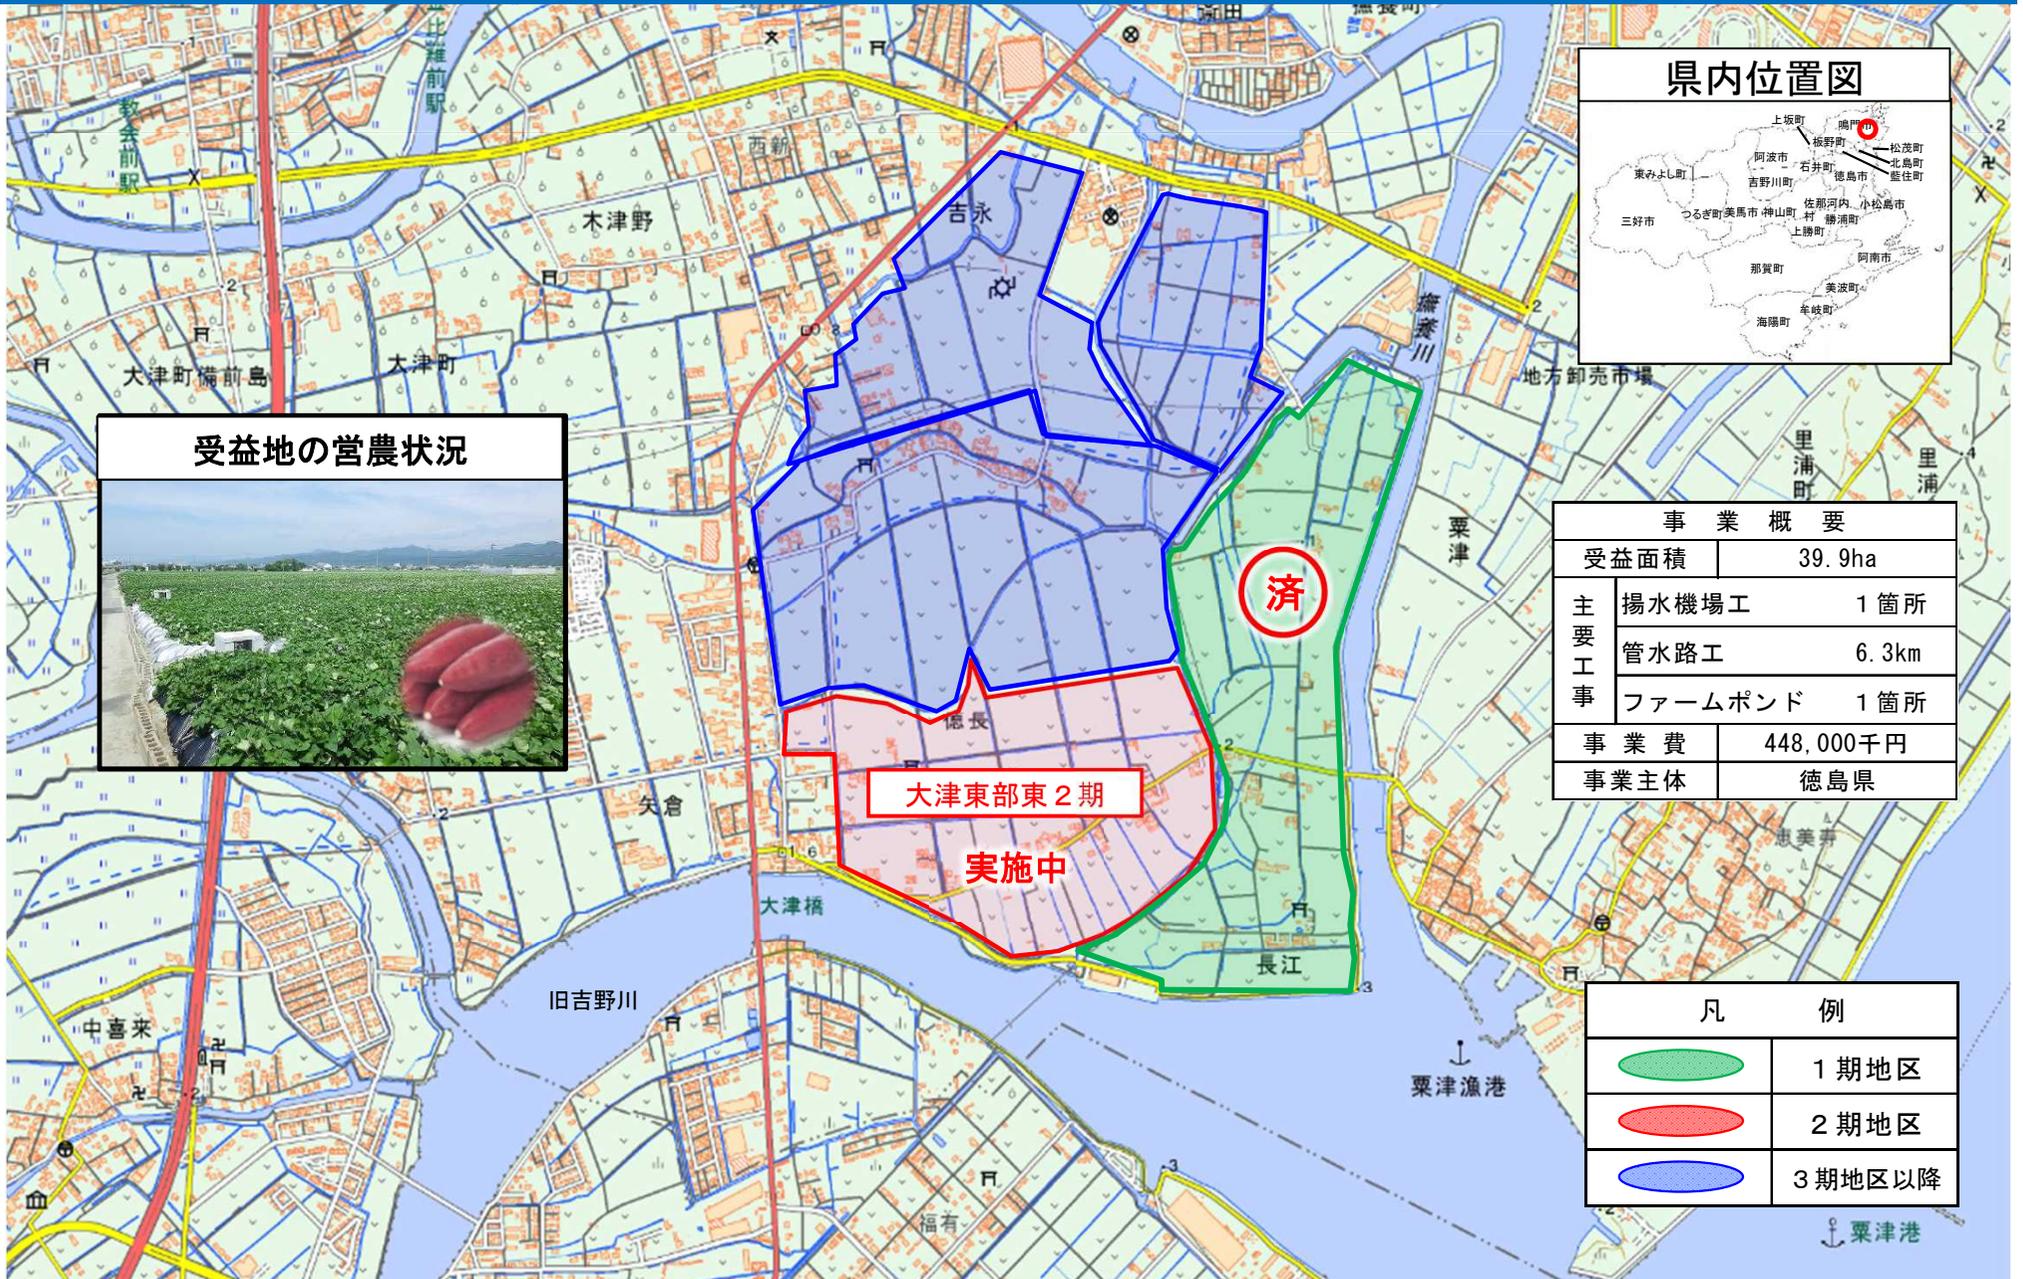

# 3. 整備計画

## 【課題】

- ・混住化に伴う農業用水の水質悪化
- ・用排水施設の機能低下

## 【対応】


- ・水源転換による水質改善
- ・パイプライン化による営農の省力化

## 整備計画のイメージ

### 【現況】既存水路からの汲み上げ



### 【整備後】先行地区での施設使用状況

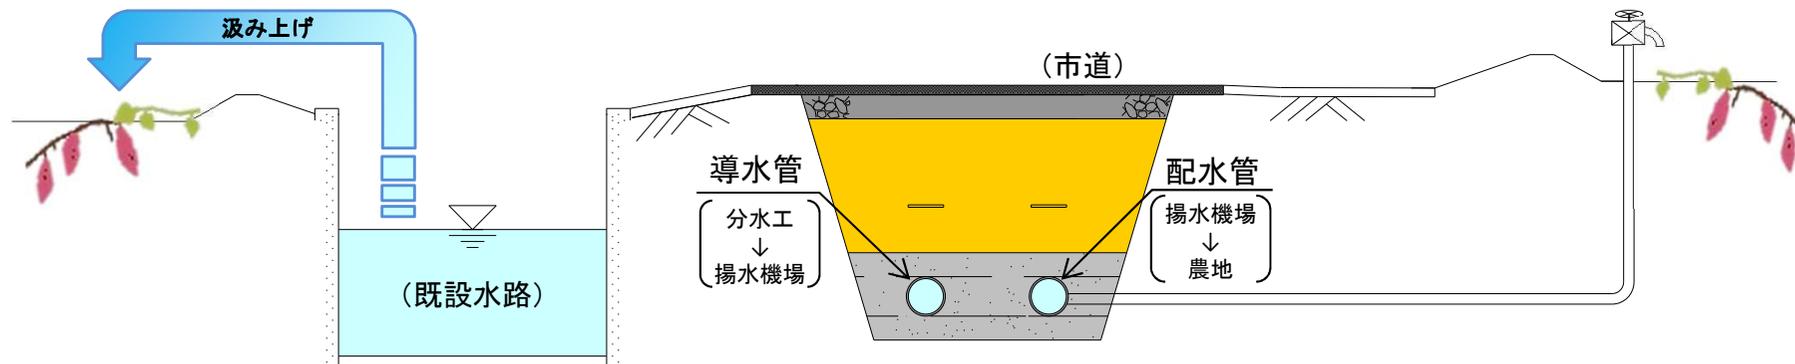

# 4. 実施状況


揚水機場



(パイプライン)  
用水路



## 5. 今後の見通し

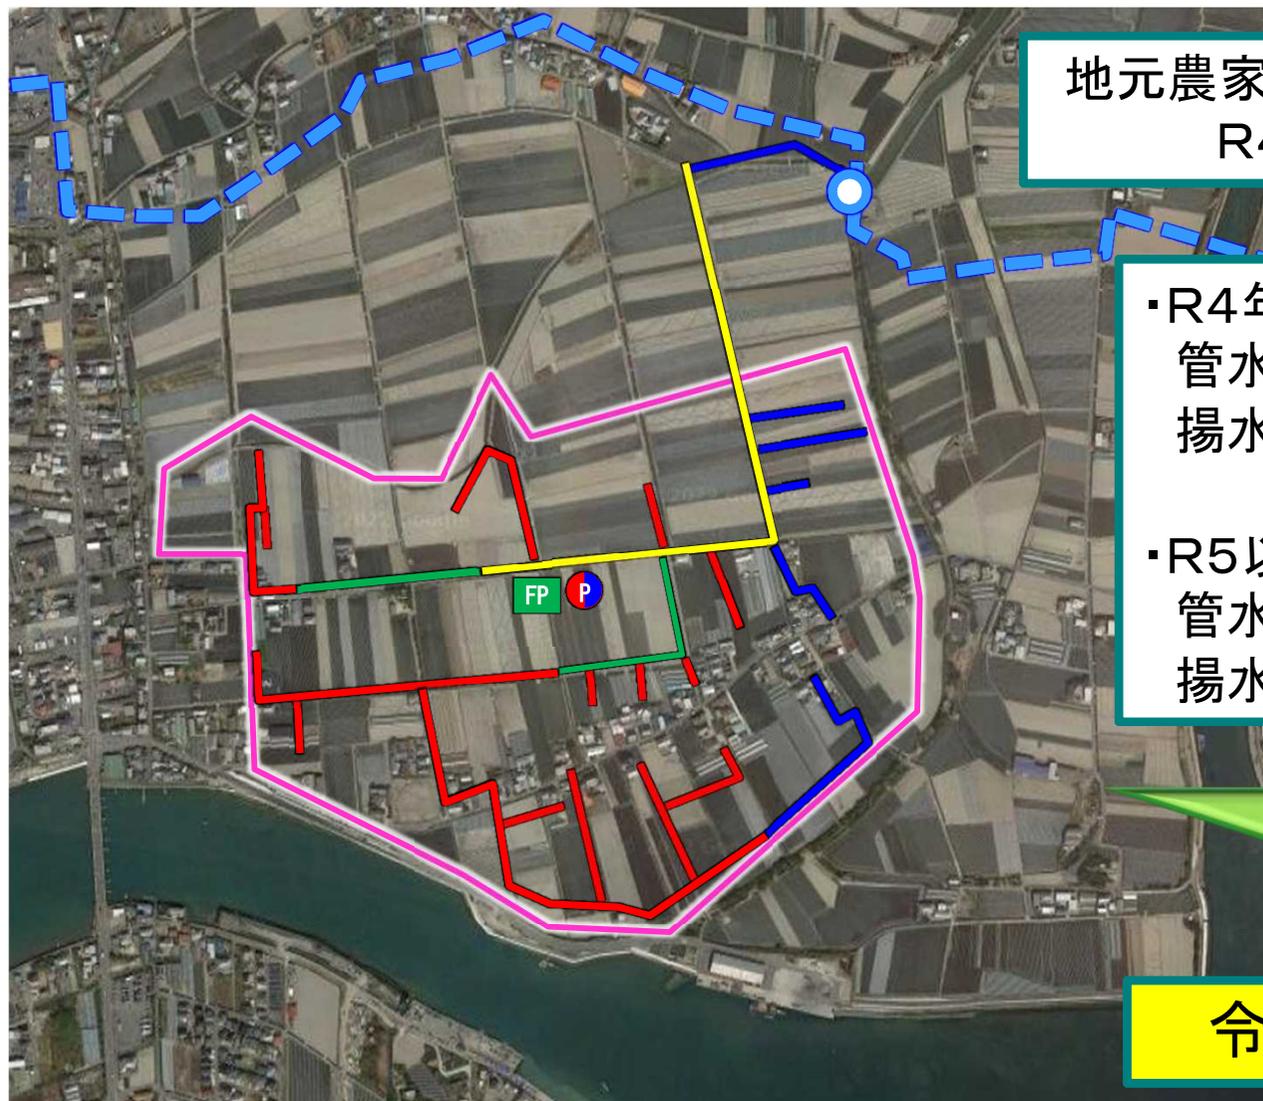

地元農家等の推進体制により,順調に進捗  
R4末で83%(事業費ベース)

- ・R4年度までの進捗(見込み)  
管水路工4.6km  
揚水機場(建屋、ファームポンド)
- ・R5以降の残工事  
管水路工1.7km  
揚水機場(ポンプ設備)

令和6年度完了を目指す

## 6. 費用対効果

### 総 便 益

- 1 作物生産効果
- 2 営農経費節減効果
- 3 維持管理費節減効果
- 4 水源かん養効果
- 5 国産農産物安定供給効果

**56億1,814万7千円**

### 総 費 用

事業効果発現に必要な費用

**49億8,994万1千円**

$$\text{総便益} / \text{総費用} = 1.13$$

■今後の対応方針（案）

**事業継続**
