

再評価【番号9】砂防・気候防災課

才毛谷
通常砂防事業


1. 事業概要

位置図



才毛谷通常砂防事業


溪流全景

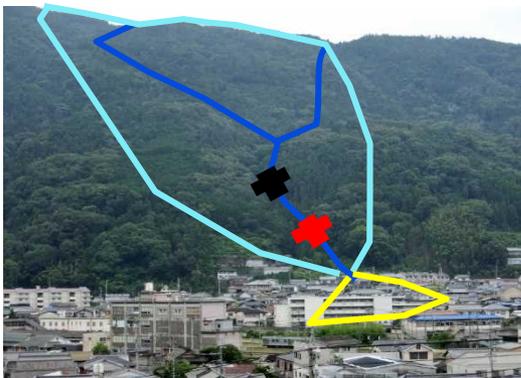

流域概要図

砂防堰堤
1基

砂防堰堤(予定)	
溪流保全工(予定)	
保全対象家屋	
土石流想定氾濫区域	

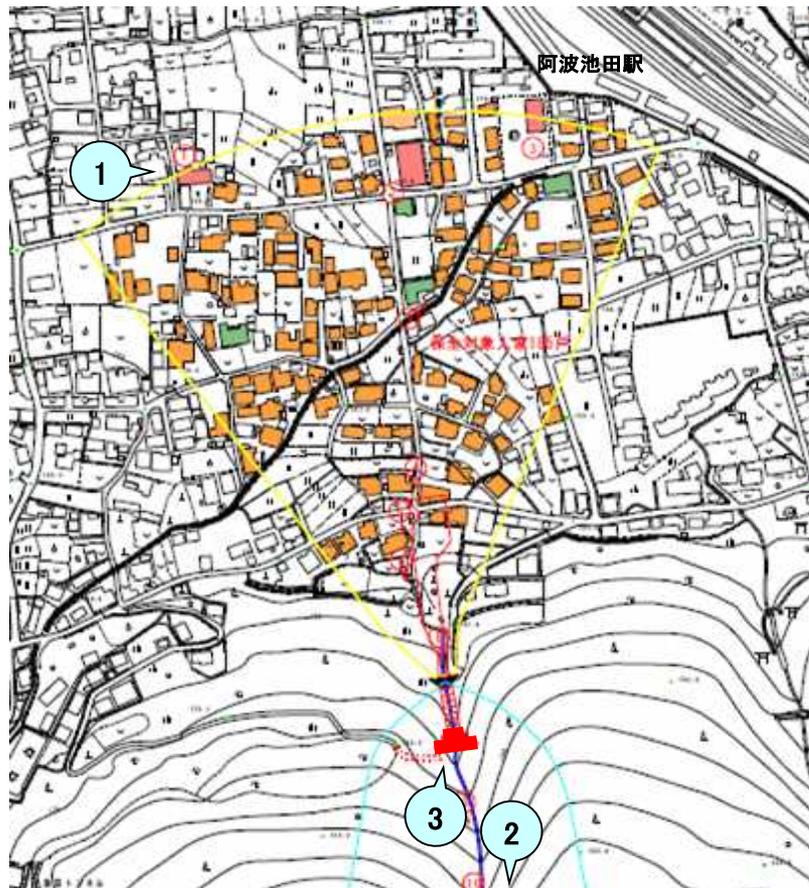

① 保全対象(要配慮者利用施設)



② 溪流荒廃状況




③ 砂防堰堤整備位置



2. 事業計画

平面図

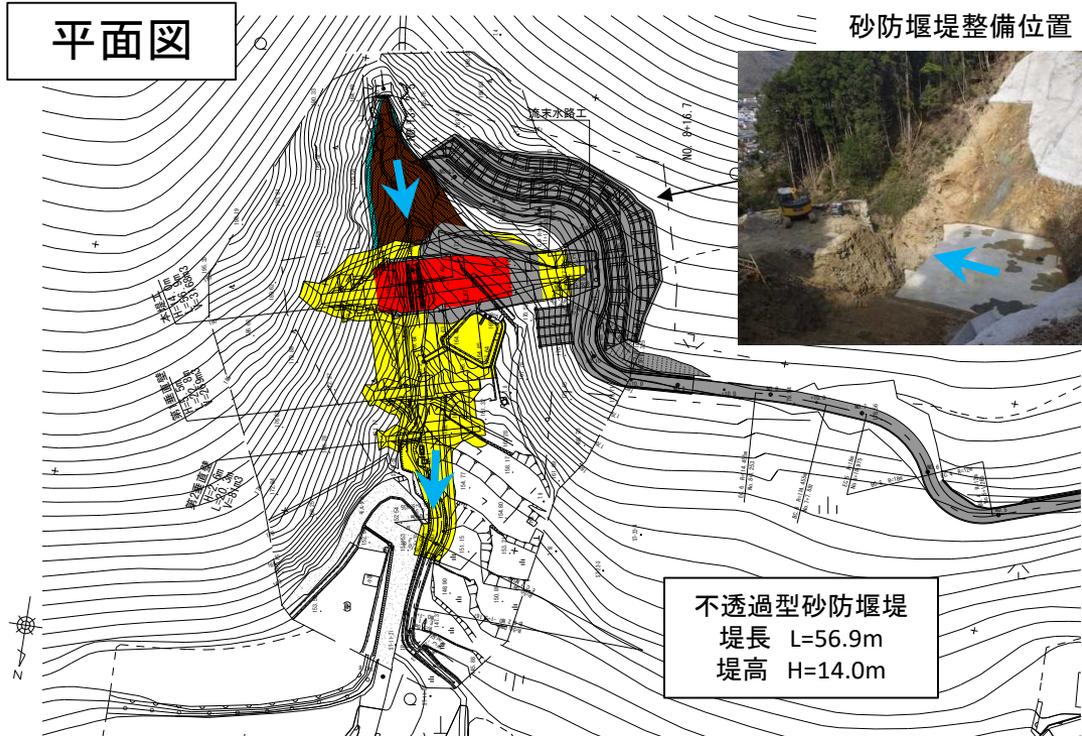

進捗率

事業費 62%

用地 100%

図面の凡例

- 計画堆砂域
- 計画高水位
- 流水方向

全体事業費

3.2 → 4.6 (億円)




完了時期

R4 → R7

凡例

- 施工済み (R3まで)
- 施工予定 (R4)
- 施工予定 (R5以降)

縦断図

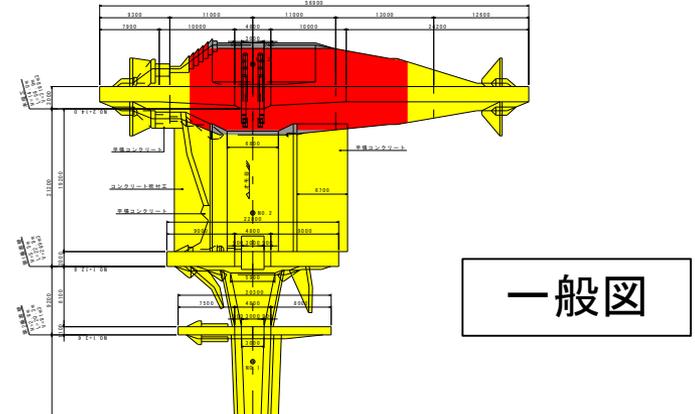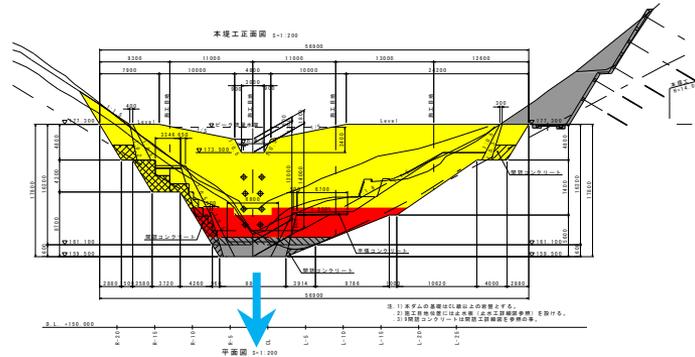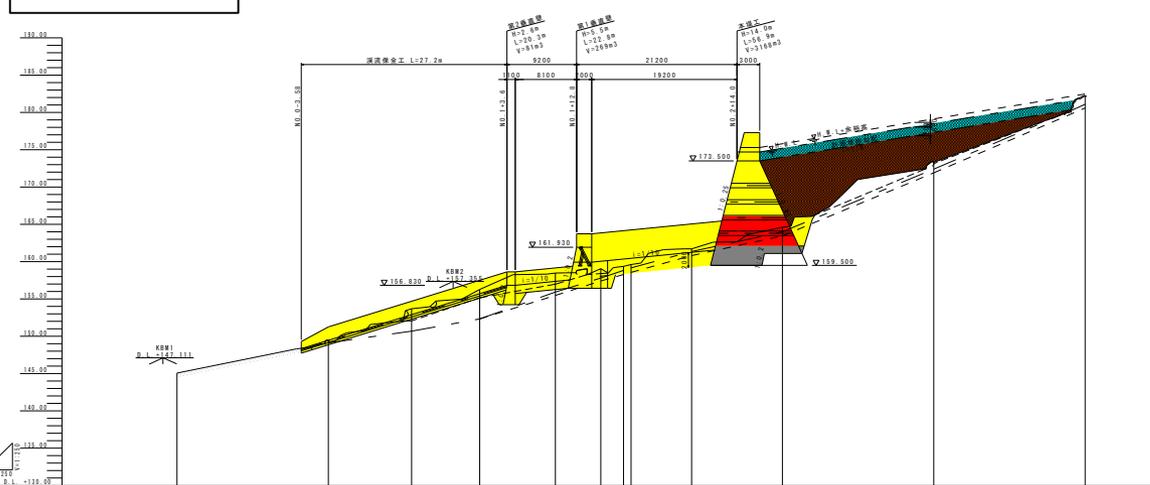

一般図

3. 今後の対応方針（案）

費用対効果分析

総便益

- 一般資産被害軽減効果
- 人的被害軽減効果
- 公共土木施設等被害軽減効果
- 公益事業施設等被害軽減効果
- 応急対策費軽減効果

B = 52.4億円（現在価値化後）

総費用

- 事業費
- 維持管理費

C = 5.3億円（現在価値化後）

$B/C = 9.8$

■ 今後の対応方針（案）

事業継続

主な保全対象

保全対象

- 人家185戸
- 要配施設



要配慮者利用施設

