


再評価【番号12】砂防・気候防災課

宮内
急傾斜地崩壊対策事業

2. 事業計画

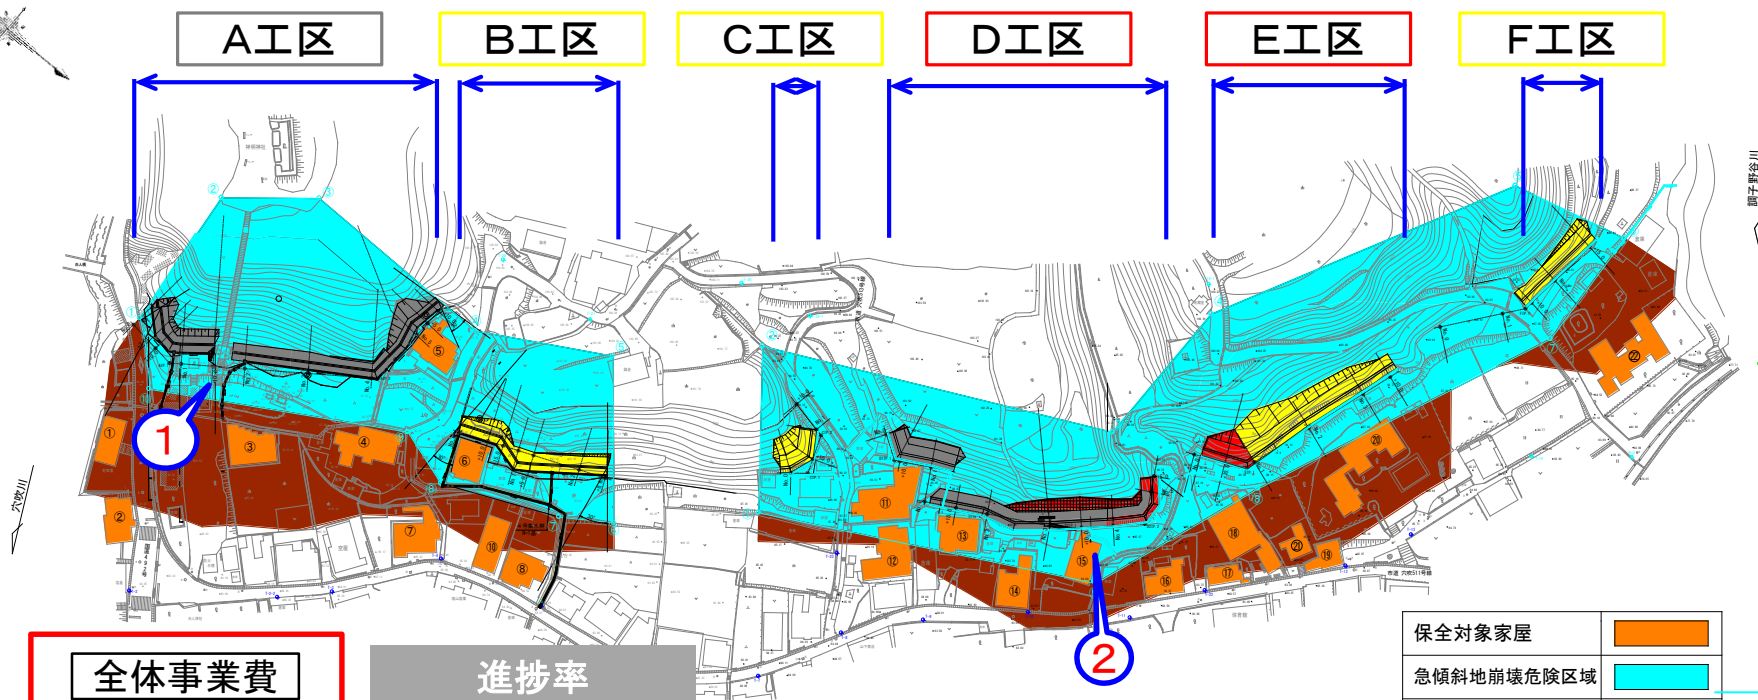

全体事業費
3.5 → 3.9 (億円)

完了時期
R4 → R7


進捗率	
事業費	72%
用地	85%

保全対象家屋	
急傾斜地崩壊危険区域	
被害想定区域	
指定地範囲	
対策工 (R4)	
対策工 (施工済)	
対策工 (R5以降)	

① A工区完成



② D工区 擁壁工完成

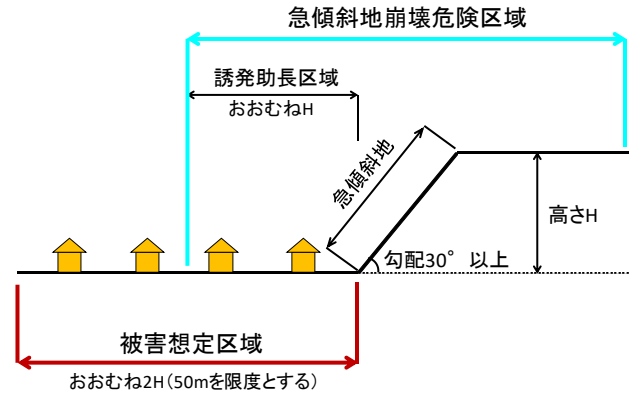

3. 今後の対応方針（案）

費用対効果分析

総便益

- 一般資産被害軽減
- 人的被害軽減
- 公共土木施設等被害軽減

B = 26.4億円（現在価値化後）

総費用

- 事業費
- 維持管理費

C = 4.7億円（現在価値化後）

B / C = 5.6

主な保全対象

- 人家 19戸
- 公益施設 3戸
- 国道492号(避難路)・市道



宮内東集会所
（避難所）



宮内西集会所
（避難所）



口山郵便局



急傾斜地崩壊危険区域	
被害想定区域	
土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	

事業継続
