


再評価【番号9】

老朽ため池等整備事業
大師池地区


1. 事業箇所



2. 事業計画

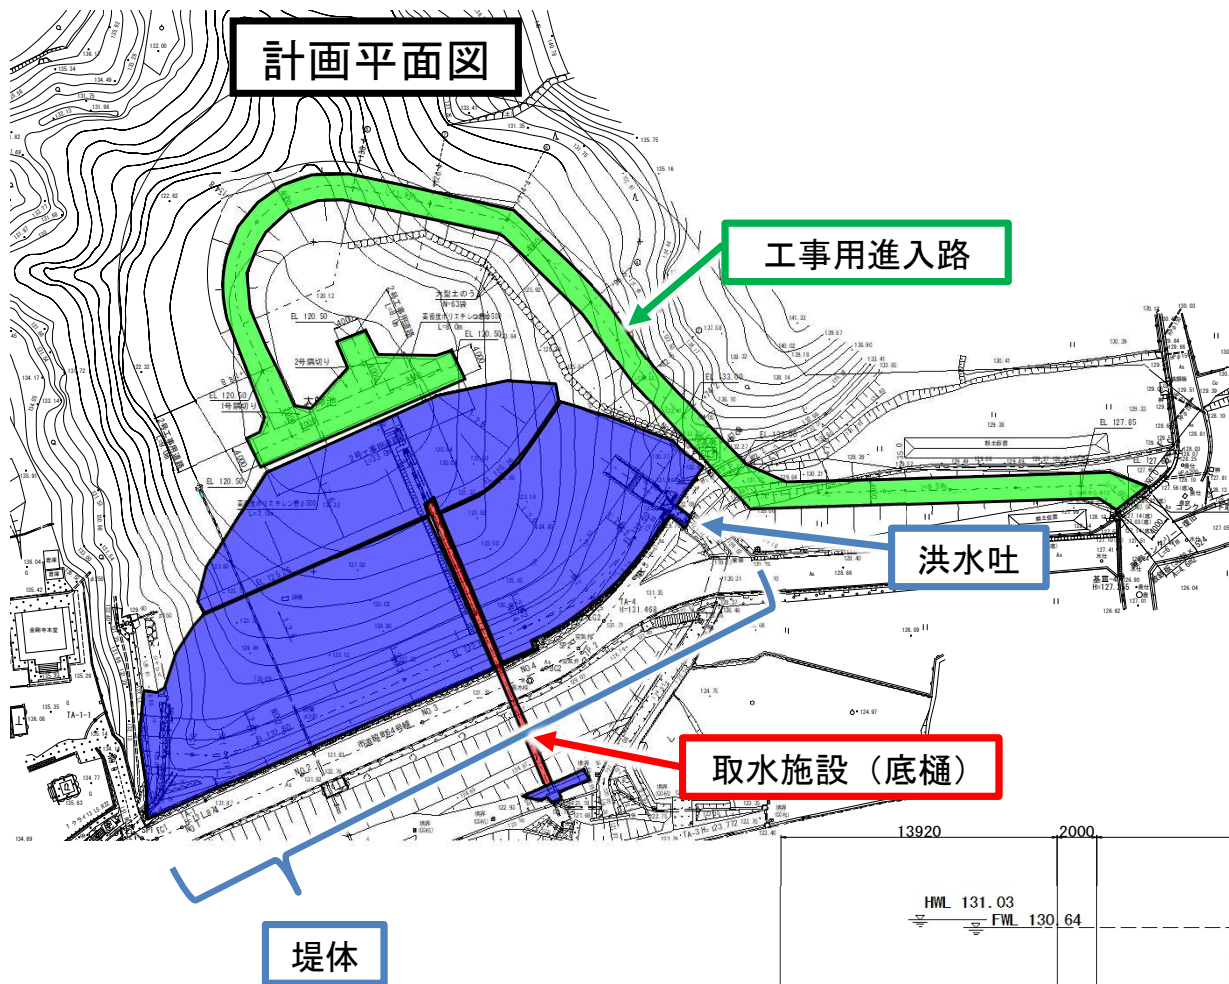

凡 例	
	令和 3年度まで
	令和 4年度
	令和 5年度予定
	令和 6年度以降

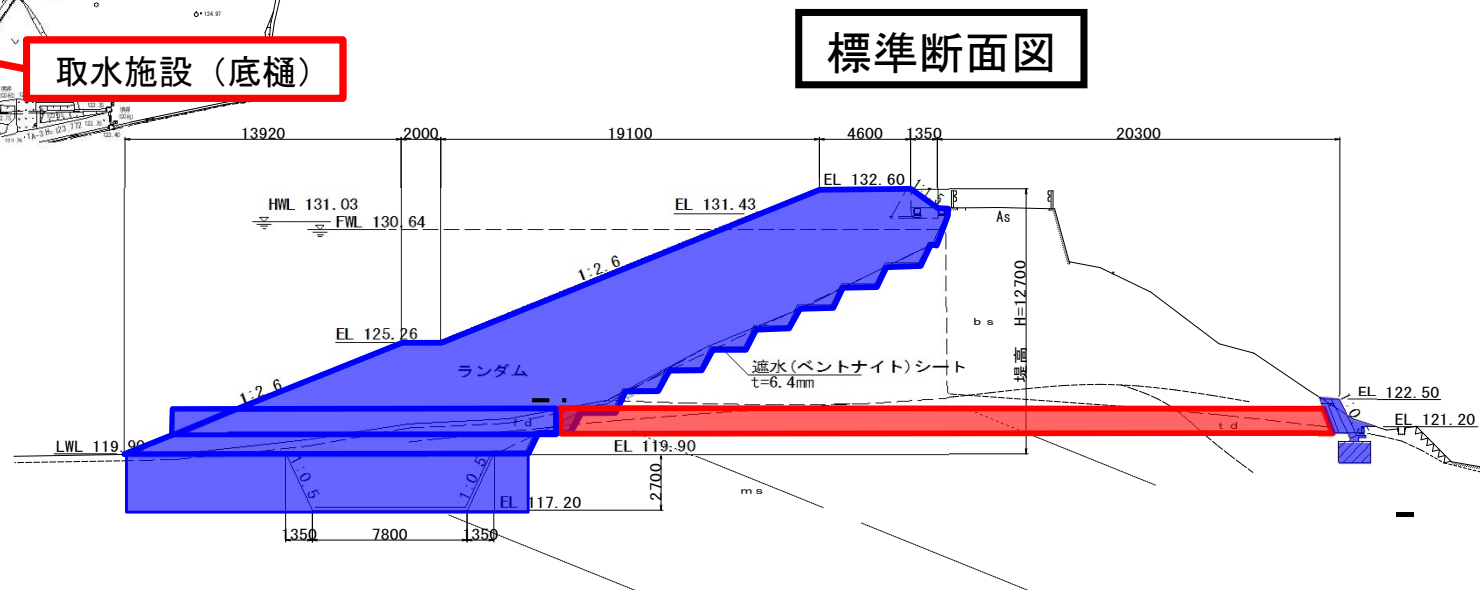


3. 整備計画

【現況】

- ・ 取水施設の老朽化（斜樋：φ150）
（底樋：φ300）
- ・ 洪水吐の排水能力不足
（水路流入式B=1.6m）
- ・ 堤体高さ不足、堤体断面の变形

【計画】

- ・ 取水施設の改修（斜樋：φ150）
（底樋：φ800）
- ・ 洪水吐の改修
（正面越流堰式B=3.0m）
- ・ 堤体余裕高確保、堤体の補強

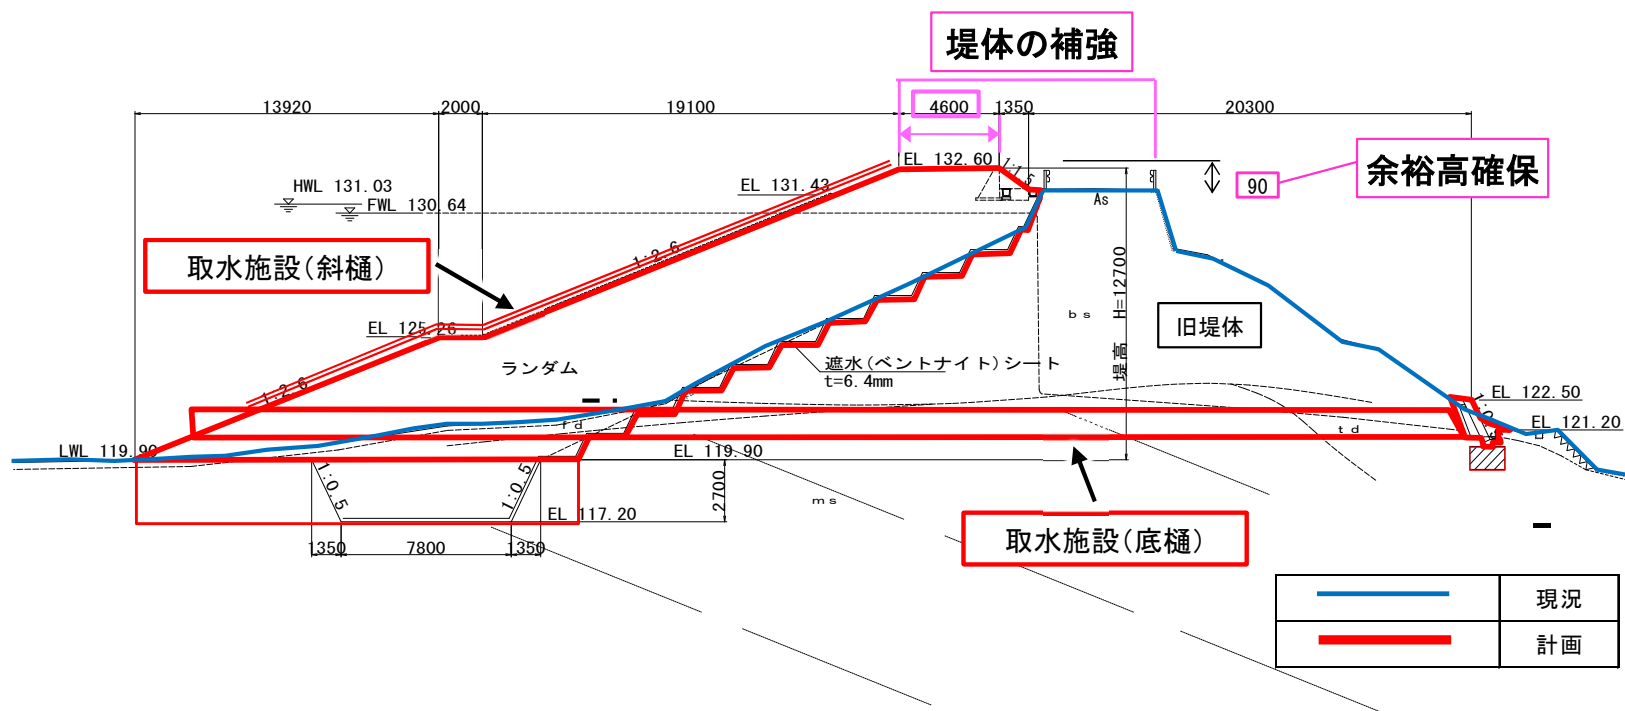

4. 実施状況

環境配慮

捕獲状況 (オオタニシ)



避難状況 別のため池へ



工事中用道路

満水時



落水時



取水施設


施工前



施工予定




5. 今後の見通し

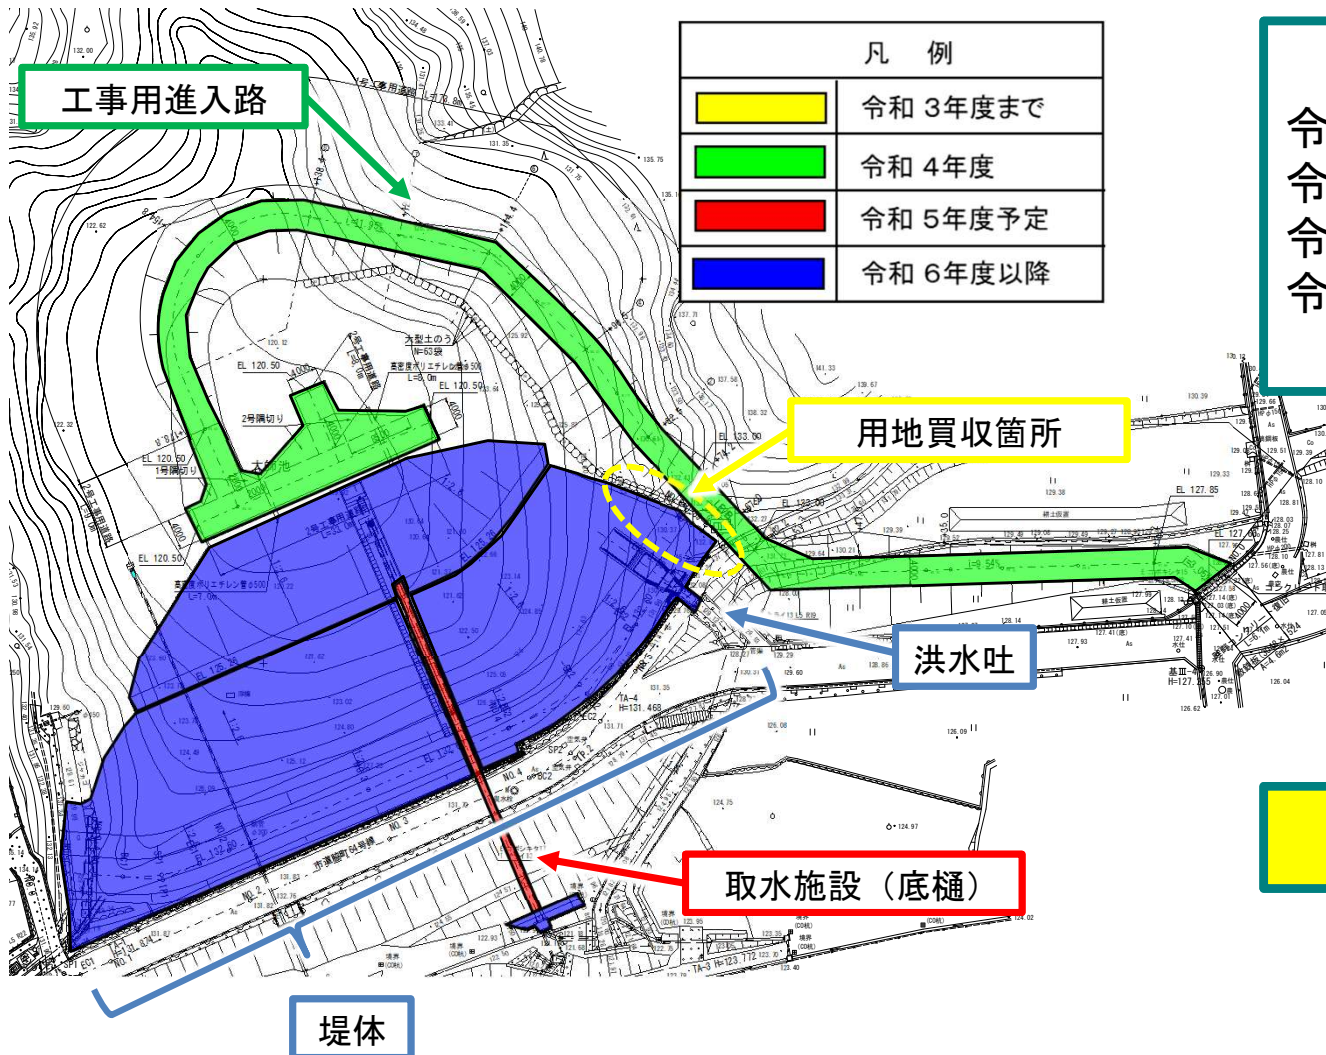

令和6年度: 堤体工事
令和7年度: 堤体工事
令和8年度: 堤体工事、洪水吐
令和9年度: 付帯工事(安全施設等)

令和9年度完了を目指す

6. 費用対効果

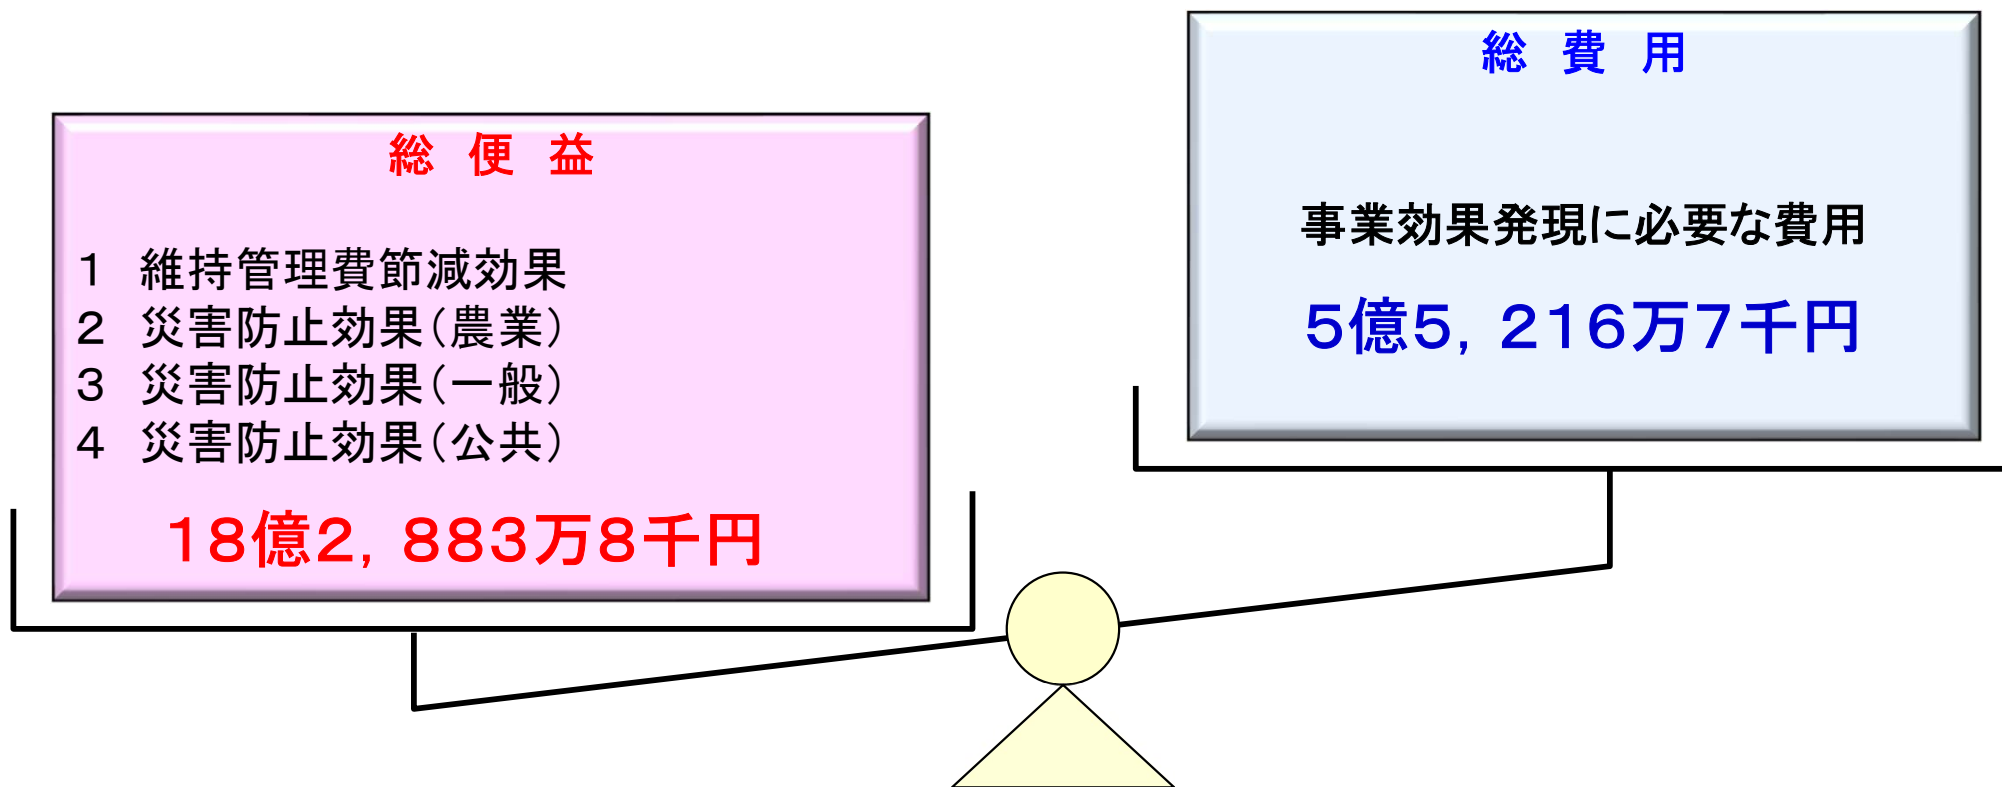

$$\text{総便益} / \text{総費用} = 3.31$$

■今後の対応方針 (案)

事業継続
