


再評価【番号4】

地盤沈下対策事業  
小松島地区


# 地区概要・事業目的

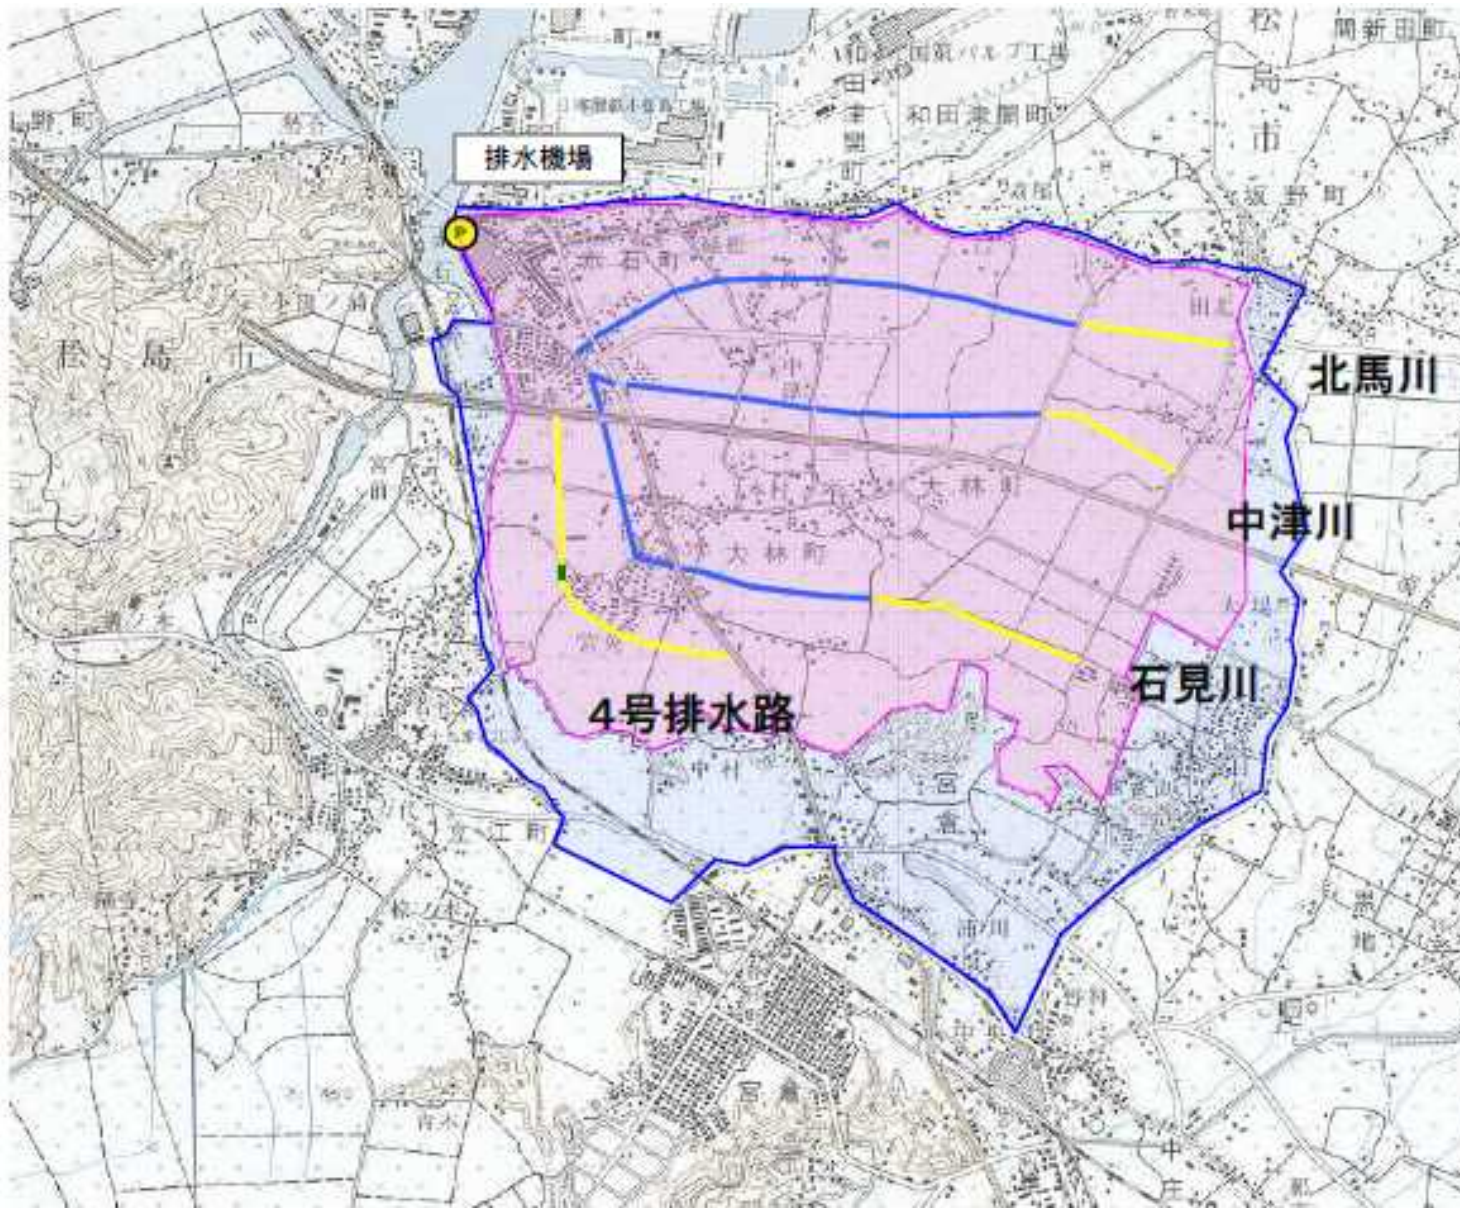

凡 例	
集水区域	
受益区域	
排水機場	
排水路	

凡 例	
	平成22年度まで
	平成23年度～平成27年度まで
	平成28年度予定
	平成29年度以降

# 事業内容・進捗状況

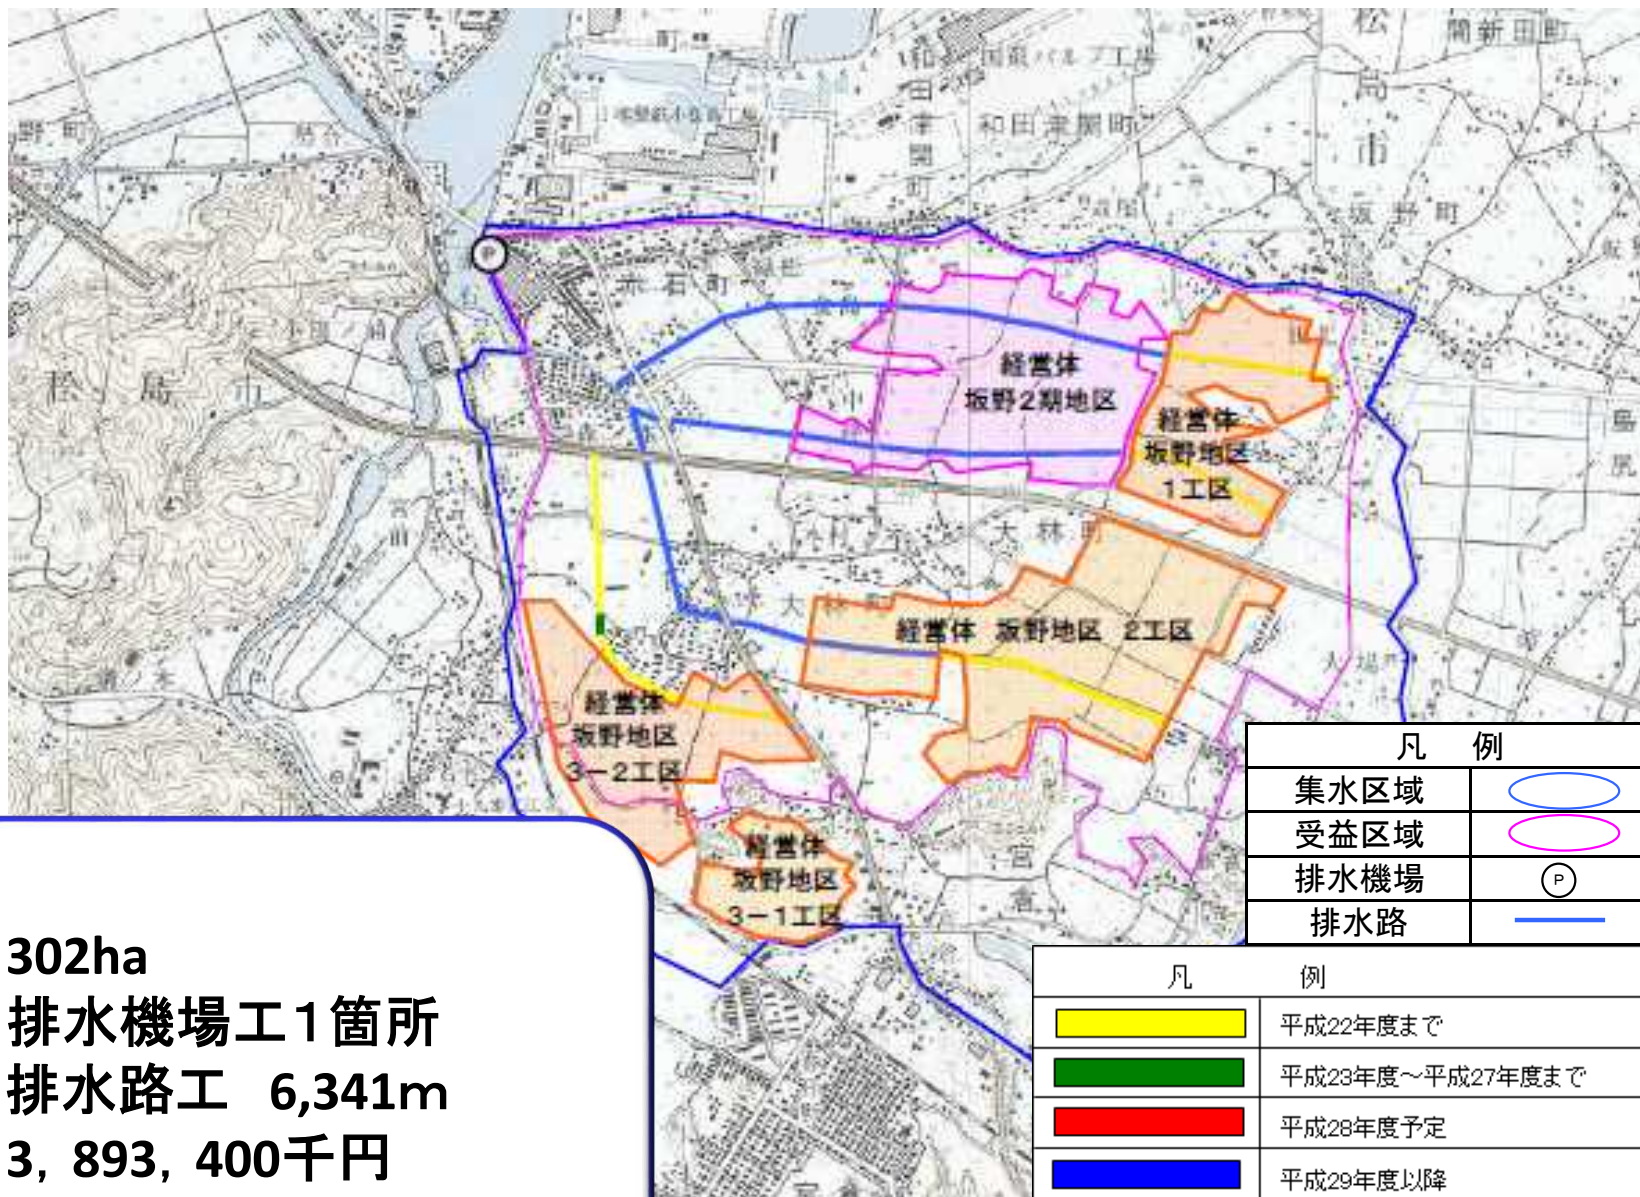

事業内容  
受益面積  
主要工事


302ha  
排水機場工 1箇所  
排水路工 6,341m  
3, 893, 400千円  
平成4年度～平成32年度

総事業費  
工 期

# 事業効果の発現状況(1)



# 事業効果の発現状況(2)

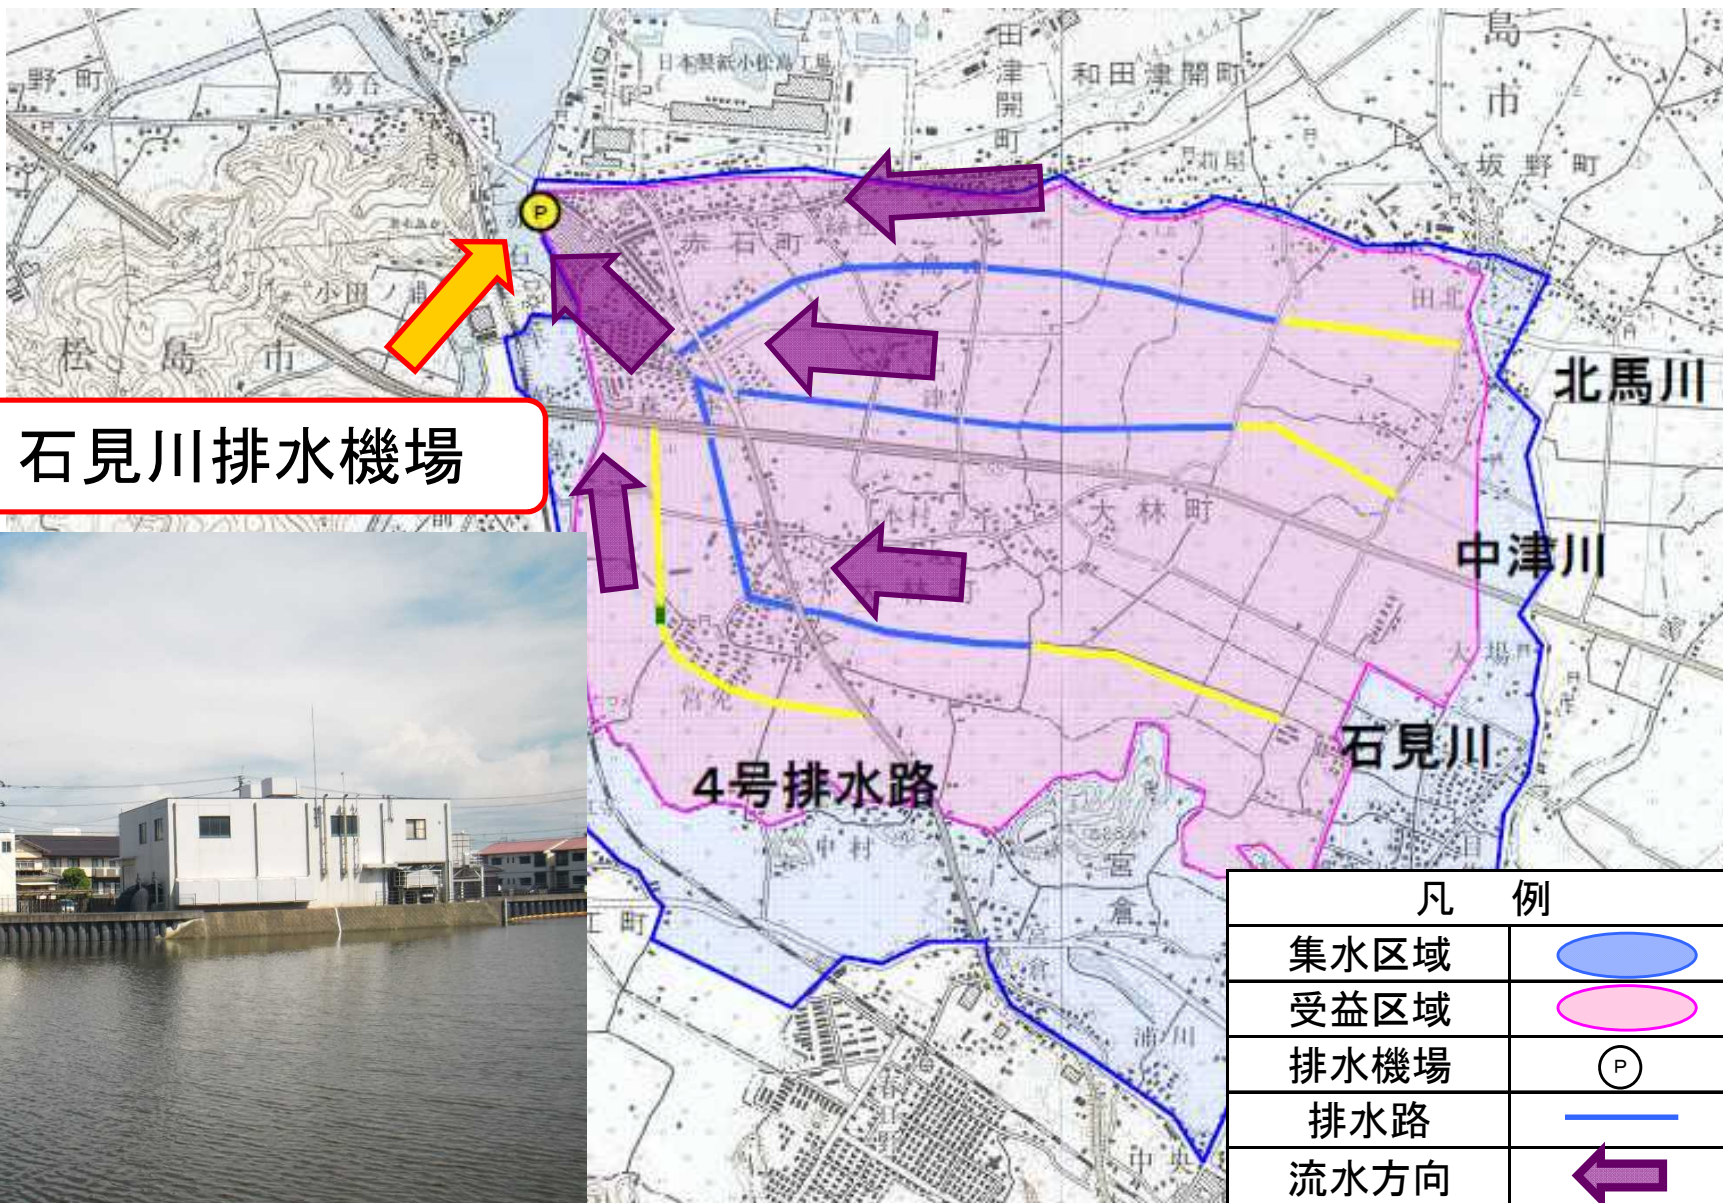

# 事業効果の発現状況(3)

① 苺

② オクラ

③ きゅうり

④ ブロccoli

北馬川

中津川

石見川

4号排水路

赤石町

大林町

宮前

宮倉


浦川

中津開町

和田津開町

日本製紙小松工場

# 前回の再評価以降の取組状況・今後の見通し

凡 例	
集水区域	
受益区域	
排水機場	
排水路	

## 坂野2期地区内

- ・坂野2期地区内の用地買収
- ・排水路管理道工事実施


- ・確定測量着手
- ・換地計画確定

- ・残りの創設非農用地取得
- ・排水路工事実施

## 坂野2期地区外

- ・4号排水路工事完了

- ・市と協力し、用地取得
- ・排水路工事実施

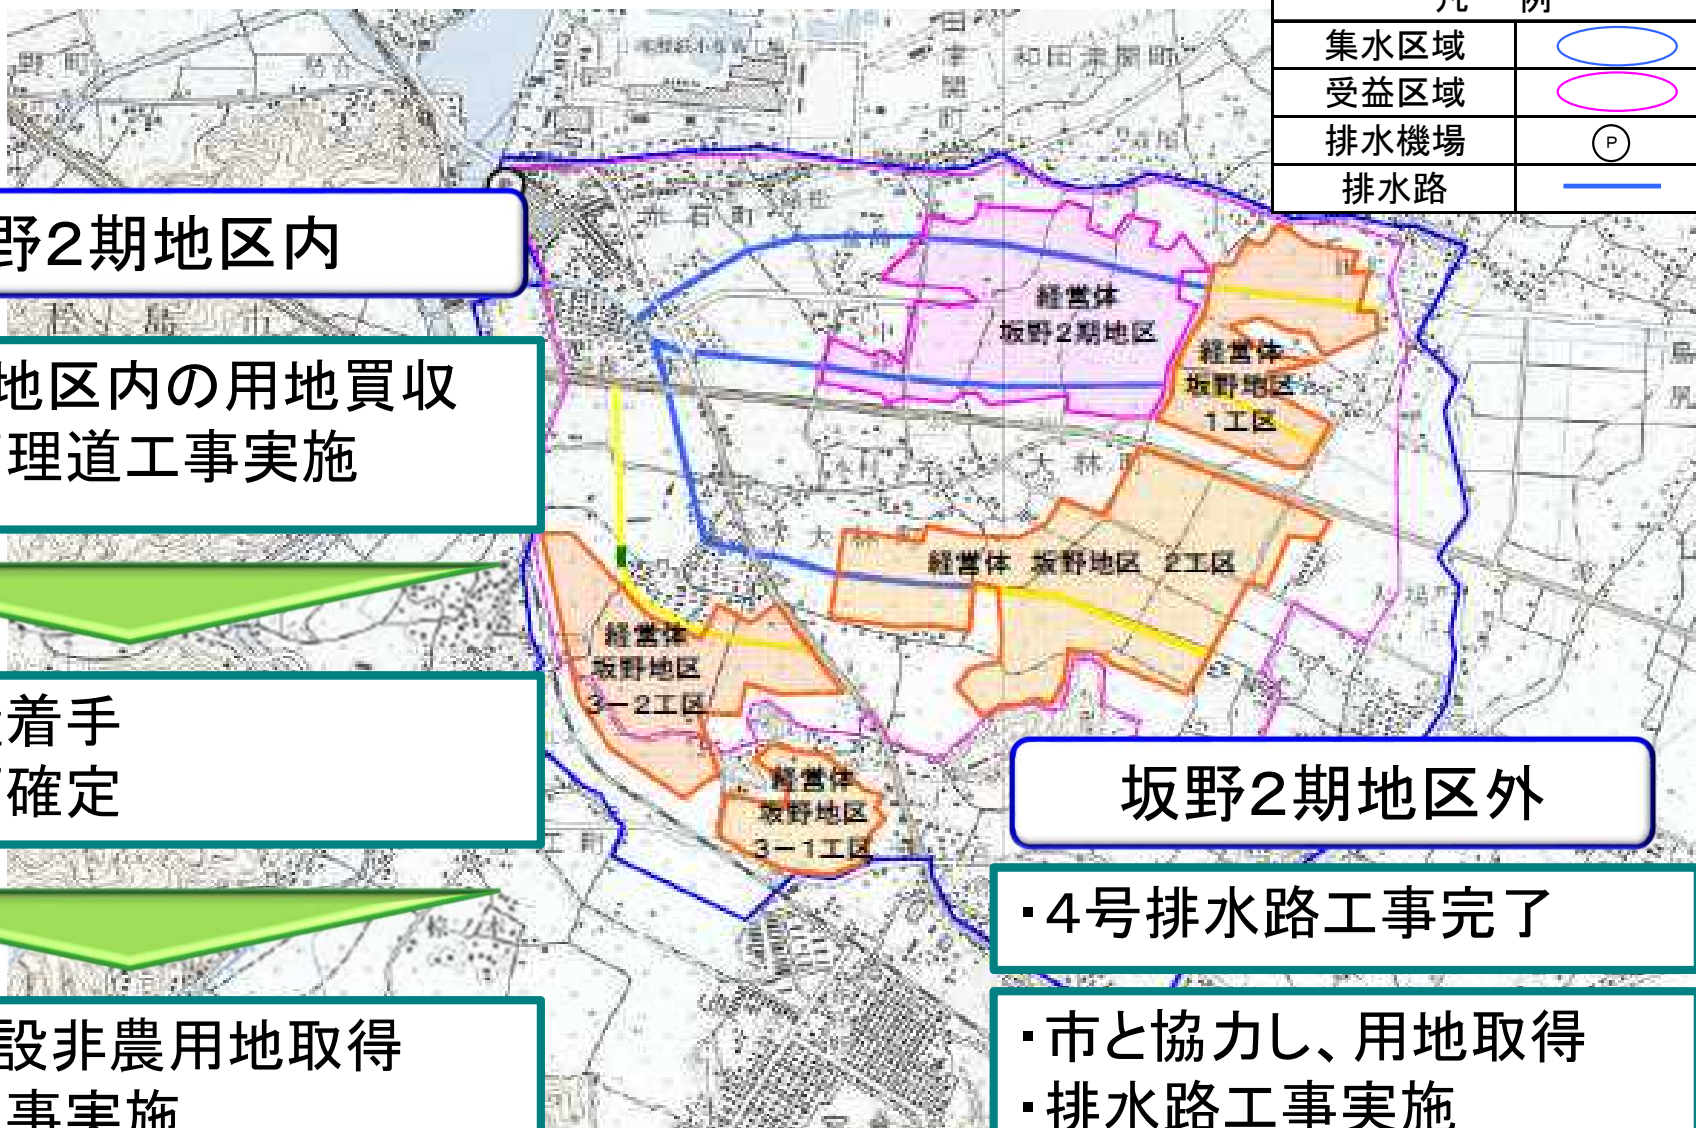

# 費用対効果

## 総便益

- 1 作物生産効果
- 2 営農経費節減効果
- 3 維持管理費節減効果
- 4 災害防止効果
- 5 国産農産物安定供給効果

計**73億2,981万8千円**  
(現在価値)

総費用 **56億1,199万5千円**(現在価値)

**総便益** / **総費用** = **1.30**



# 現時点における事業効果の検証

1 類似地区の事後評価を踏まえた効果発現状況

2 社会経済情勢の変化

