

＜提示工期設定事例＞


◆発注事例 1（舗装工事 請負対象額2,000万円の場合）

- ・ 余裕日数 90 日（6ヶ月以内で自由に設定可能）
- ・ 準備日数 50 日（土木工事工期算出要領）
- ・ 標準的な工事の実工事日数 55 日（〃）
- ・ 後片付け日数 20 日（〃）
- ・ 工期（標準工期） 215 日（125 日）


◆発注事例 2（道路改良工事 請負対象額5,000万円の場合）

- ・ 余裕日数 20 日（6ヶ月以内で自由に設定可能）
- ・ 準備日数 40 日（土木工事工期算出要領）
- ・ 標準的な工事の実工事日数 200 日（〃）
- ・ 後片付け日数 20 日（〃）
- ・ 工期（標準工期） 280 日（260 日）

■通常工事



■工事着手日選択契約方式

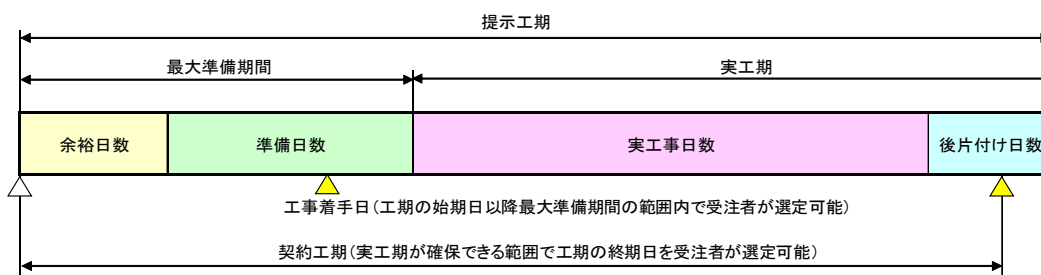

■工事着手日選択契約方式（当面の運用）

